प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाको राजनैतिक नक्सा

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान नगरपालिकाबाट आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा संचालित योजना/कार्यक्रमहरूको बार्षिक प्रगति समिक्षा

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

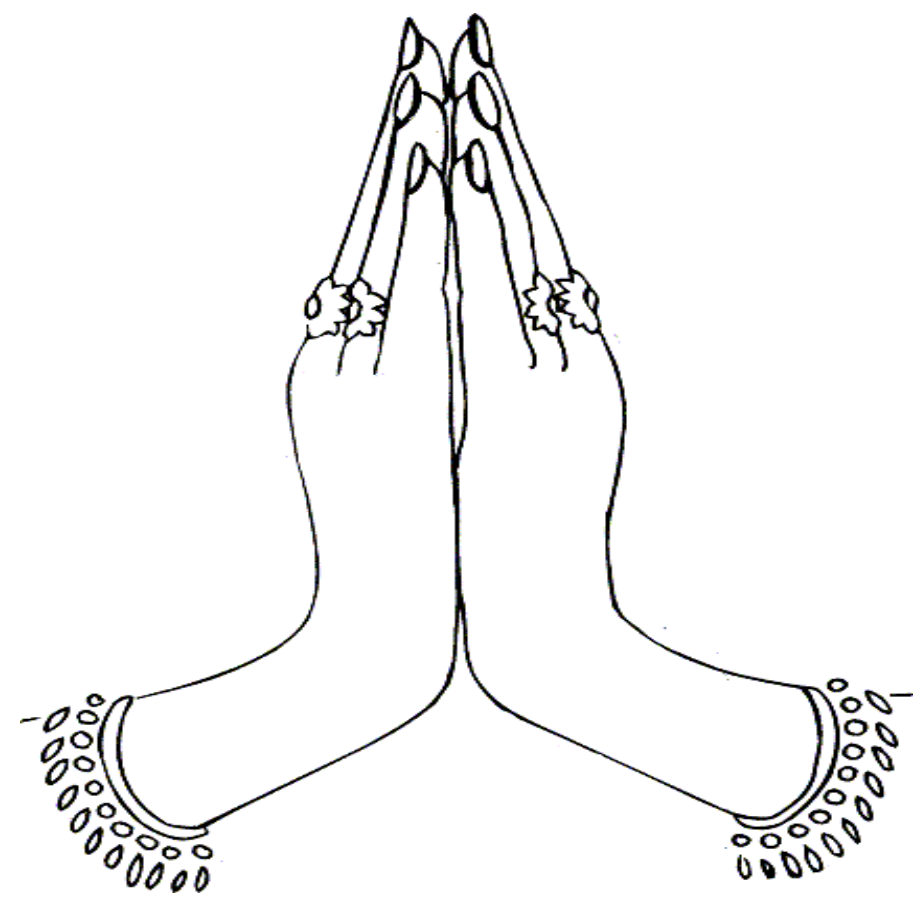

हार्दिक स्वागत

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

बजेट स्रोत अनुसार

बिवरण	बजेट अनुमान	बजेट प्राप्त	बजेट खर्च	खर्च प्रतिशत
समानीकरण अनुदान				
संघ	१२४,२००,०००	१२४,२००,०००	१०२,७१२,०४४	८३
प्रदेश	४,५२९,०००	४,५२९,०००	१,६४३,५१०	३६
राजश्व बाँडफाड				
संघ	१००,१००,०००	५४,०८४,५७६	५४,०८४,५७६	१००
प्रदेश	१४,९६८,०००	९,६५४,४०३	७,९७३,९५३	८३
आन्तरिक स्रोत	३१,७७४,६२०	२३,०६३,१००	२३,०६३,१००	१००
गत बर्षको भुक्तानी	७२,५९४,२९८	७२,५९४,२९८	६४,१९८,८३५	८८
अन्य अनुदान	३७,२२२,२८८	३७,२२२,२८८	३७,२२२,२८८	१००

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

बजेट स्रोत अनुसार

सशर्त अनुदान				
संघ	२७६६१७०००	२७४८७४०००	२४८८५७०३९	९१
प्रदेश	१५३४००००	१५००००००	१४९७८१८४	१००
विशेष अनुदान				
संघ	२००००००००	२००००००००	१५४८६०६५	७७
प्रदेश	७००००००	७००००००	६९५९११६	९९
समपुरक अनुदान				
संघ	३६०००००	३६०००००	२२४९६८८	६२
प्रदेश	२००००००००	१५००००००	१५००००००	१००
जम्मा	७२७९४५२०६	६६०८२१६६५	५९४४२८३९८	८१.६६

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

बजेट स्रोत अनुसार

को.ले.नि.का बाट भएको खर्च				
स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम	१००००००००	८९२९०४५	८९२९०४५	१००
सामाजिक सुरक्षा	७२६००००००	७२६००००००	७१९००३००	९९
गरिबसँग विश्वेश्वर	७००००००	६३२५००	६३२५००	१००
पञ्जीकरण शाखा	१५१३०००	९०२२८१	९०२२८१	१००
कूल जम्मा	८४,८१३,०००	८३,०६३,८२६	८२,३६४,१२६	९९.१६

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

२०७६।०७७ को खर्च विवरण

बिवरण	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च %
चालु खर्च	४४,६२,८९,०४९	३८,४९,६३,००६	८६.२६
पुजिगत खर्च	२८,१६,५६,१५७	२०,९४,६५,३९२	७४.३७
जम्मा खर्च	७२,७९,४५,२०६	५९,४४,२८,३९८	८१.६६

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

क्षेत्रगत रूपमा खर्च विवरण

बिवरण	बजेट	खर्च	खर्च %
आर्थिक विकास	५,०८,७४,०५७	३,६०,०३,३४४	७०.७७
पूर्वाधार विकास	११,९३,९७,६९४	८४,७६४,७२०	७०.९९
सुशासन तथा क्षमता विकास	३९,५२,०४७	१०,९८,०६३	२७.७८
सामाजिक विकास	४४,९१,७१,५५२	४०,०२,८७,४०५	८९.१२
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	१०,४५,४९,८५६	७,२२,७४,८६६	६९.१३
जम्मा	७२,७९,४५,२०६	५९,४४,२८,३९८	८१.६६

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाबाट सन्चालित आयोजनाहरुको शारांस विवरण

सि.नं.	शीर्षक गत खर्च	योजना संख्या	विनियोजित रकम	योजनाको प्रगति			खर्च रकम
				सम्पन्न	चालु	सम्झौता नभएको	
१	सडक	६७	४,२२,७८,९८४	५७	८	२	२,२०,५८,८३९
२	खानेपानी	६२	७,२४,८५,३९९	५७	५		५,३५,१५,७४१
३	सिंचाई	२९	५९,१४,२००	२२	७		३५०५८३९
४	भवन (विद्यालय भवन समेत)	४६	५,३०,१२,९५१	४५	१		४६९५७३८०
५	पर्यटन पूर्वाधार तर्फ	२२	१,००,१५,३५०	१९	३		२४,७८,३५०
६	अन्य पूर्वाधार/प्रधानमन्त्री रोजगार	३९	४,८९,५९,५३७	३६	३		३,२८,४१,३२६
७	नदी नियन्त्रण	१	६०,००,०००	१			६०,००,०००
८	कृषि, पशुसेवा, आयआर्जन तर्फ	१९	१,२३,४४,०००	१९			१,२३,४४,०००
	जम्मा	२८५	२५,१०,१०,४२१	२५६	२७		१७,९७,०१,४७५

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाबाट सन्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको प्रगति - पूर्बाधार तर्फ

सि नं	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	बिनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	बित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	विस्तृत संभाव्यता अध्ययन	१५००	०	०	०
२	खरिबोट पारपाखा आपपाटा बुढादेवी टाकुरा स्यालापाखा खरिबोट चक्रपथ	६०००	६०००	१००	१००
३	ढुङ्गेठाटी ठुलोगाउ देउराली औखरवोट सेपुङ खाधेचौर मोटर बाटो निर्माण	९०००	४२१२	४७	४७
४	ढुङ्गेठाटी स्वामीफेद काफलवुटा लम्छयाङ्गनेटा भलापानी खप्याङखोला मोटर बाटो निर्माण	६०००	२९३७	४९	४९
५	हस्पिटल जाने बाटो	२०००	०	०	०
६	सिंचाइ	२०००	३४०	१७	१७
क	प्यूठान नगरपालिका ९ को हरियाली कुलोको बाक्से नजिक कुलो, खेत, झोलुङ्गेपुल तथा नाला संरक्षण	५००		०	६०
ख	धर्मावती कुलो मर्मत	३००		०	२०
ग	रानीकुलो मर्मत	२००	२००	१००	१००
घ	गोर्खे कुलो मर्मत	२००		०	२०
ङ	उपार्दे कुलो मर्मत	२००		०	०
च	क्वाडे कुलो मर्मत	४००	१४०	३५	३५
छ	खैरा कुलो मर्मत	२००		०	०

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाबाट सन्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको प्रगति - पूर्बाधार तर्फ

सि नं	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	बिनियोजित रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	बित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
७	खानेपानी तथा सरसफाइ योजना निर्माण	१०००	३९९	४०	४०
८	दाखाकोट विसमुरे खानेपानी योजना प्रदेश समपुरक	५०००	०	०	२०
९	मरन्ठानाकोट खानेपानी योजना प्रदेश समपुरक	५०००	१२१९	२४	२४
१०	विसमुरे विजयनगर खानेपानी योजना	५०००	०	०	२०
११	सत्तरी पाखाडेरा टाकुरा खमल्दी सोलार लिफ्ट खानेपानी योजना	६०००	४६५६	७८	७८
१२	जनतासंग साझेदारी कार्यक्रम	७३१७	४७९६	६६	६६
क	गेजवाङ माझकोट सडक	१२८६	४९७	३९	३९
ख	तरकारी मण्डि	१७५९	१७०९	९७	९७
ग	सशस्त्र क्याम्प	३००	३००	१००	१००
घ	स्मार्ट कृर्षि	१०८५	९८३	९१	९१
ङ	वडा नं ७ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जाने मोटरबाटो	१५०		०	०
च	वडा नं ४ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जाने मोटरबाटो	३००	२६४	८८	८८
छ	मुर्दाघर वडा नं २	५००	५००	१००	१००
ज	जगरवोट सिंचाइ	५००		०	३०
झ	भित्रीकोट रक गार्डेन	५००		०	०
ञ	वडा नं ७ को वडा कार्यालय रंगरोगन	१५०	१५०	१००	१००
ट	प्रहरी विट संरक्षण	२५०		०	०
ठ	प्यूठान रंगशाला निर्माण	५३७.३८१	३९३	७३	७३

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाबाट सन्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको प्रगति - पूर्बाधार तर्फ

सि नं	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	बिनियोजित रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	बित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१३	नदी नियन्त्रण दाखाक्वाडी खैरा (पुवार्धार समपुरक संघ)	४५००	४५००	१००	१००
१४	प्रशासनिक भवन वरीपरीका संरचना	२५००	६५	३	३
१५	भित्रीकोट गेट निर्माण	१०००		०	२०
१६	शहिद स्मृती पार्क (पुवार्धार समपुरक प्रदेश)	५०००	७२०	१४	१४
१७	समपुरक कोष	१००००	१००००	१००	१००
१८	स्वागत गेट निर्माण	५००		०	८०
१९	समपुरक कोष जि.स.स.	१८००		०	०
२०	सडक बोर्ड म्याचीङ	३५००			
क	गेजबांग टाकुरा मानागाउँ माझकोट सडक मर्मत कार्य	२७७९	१०००	३६	३६
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम - ८०५५५४०१५०१					
२१	सहकारी सिचाई, साना सिचाई मर्मत सम्भार तथा निर्माण	५००	५००	१००	१००
२२	किटघात झो.पु, प्यूठान नगरपालिका, प्यूठान	२५००	२४९९	१००	१००
२३	नवीकरणीय ऊर्जा प्रबिधिहरु (लघु तथा साना जलबिधुत, सौर्य ऊर्जा, वायोग्यास, वायोमास, ऊर्जाको उत्पादनमुलक परिप्रयोग) मार्फत ऊर्जा उत्पादन र परिप्रयोग	१२१६			
क	बडडाडा खानेपानी योजना	१२००	११११	९३	९३

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा प्यूठान नगरपालिकामा संचालन भईरहेको संघीय सरकारको समपुरक अनुदान तर्फका आयोजना

क.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	दाखाकोट (रानीचौर) खानेपानी आयोजना	३६,००,०००	७४९.६८८	२०.८२	२०.८२
	जम्मा	३६,००,०००	७४९.६८८	२०.८२४६७	२०.८२४६७

आ.व. २०७६।०७७ मा प्यूठान नगरपालिकामा संचालन भईरहेको संघीय सरकारको बिशेष अनुदान तर्फका आयोजना

क.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	जुम्रिकाँडा (ठुलागाउँ पूर्णागाऊ) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२,००,००,०००	१,५४,८६,०६५	७७.४३	७७.४३
	जम्मा	२,००,००,०००	१,५४,८६,०६५	७७.४३	७७.४३

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा प्यूठान नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको बिशेष अनुदान तर्फबाट संचालन भएका आयोजनाहरू

क.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	दाखाक्वाडी स्कीम नं. २ लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	५०००	५०००	१००	१००
२	सालघारी फूलघाट लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२०००	१९५९.११६	९७.९६	९७.९६
	जम्मा	७०००	६९५९.११६	९८.९८	९८.९८

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा प्यूठान नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदान तर्फबाट संचालन भएका आयोजनाहरू

क्र.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	बिसमुरे बिजयनगर खानेपानी योजना वडा नं. ३	५०००	५०००	१००.००	१००.००
२	मरन्ठानाकोट लिफ्ट खानेपानी योजना वडा नं. १०	५०००	५०००	१००.००	१००.००
३	खरको छाना विस्थापन कार्यक्रम	१००००	१००००	१००.००	१००.००
	जम्मा	२००००		१००.००	१००.००

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा प्यूठान नगरपालिकामा संचालन भएका प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानको आयोजनाहरू

क्र.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	बडडाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना	१५००	१५००	१००	१००
२	थापडाडा खा.पा. योजना वडा नं ४	४०००	३९७८	९९	९९
३	माझकोट भित्रीकोट खा.पा. योजना	४२००	४२००	१००	१००
४	धर्मावती माध्यमिक विद्यालय प्राङ्गण निर्माण	१३००	१३००	१००	१००
	जम्मा	११०००	१०९७८	९९.८६	९९.८६

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय तर्फको सम्पुरक अनुदान अन्तरगत शीत भण्डार निर्माण

क.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	रकम बिनियोजन		जम्मा	सम्झौता रकम	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
		प्रदेश	स्थानीय तह					
१	चिश्यान केन्द्र निर्माण, प्यू.न.पा. ४	१०२१२.८९	१४००	११६१२.८८६	११४९४.९५	०.००	०.००	०.००
	जम्मा	**१०२१२.८९**	**१४००**	**११६१२.८९**	**११४९४.९५**	**०.००**	**०.००**	**०.००**

आ.व. २०७६।०७७ मा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय तर्फको सम्पुरक अनुदान अन्तरगत झिमरूक रंगशाला निर्माण

क.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	रकम बिनियोजन		जम्मा	सम्झौता रकम	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
		प्रदेश	स्थानीय तह					
१	झिमरुक रंगशाला निर्माण	२५००	५००	३०००	३०००	२२५३.२३	७५.११	७५.११
	जम्मा	**२५००**	**५००**	**३०००**	**३०००**	२२५३.२३	७५.११	७५.११

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

संघीय सरकारको विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फका योजनाहरू

क. विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण

क.स.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	सम्झौता भएको रकम	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	शिद्ध मावि जुम्रिकाँडा ४ कोठा निर्माण वडा न ं५	३२००	३२००	३२००	१००.००	१००.००
२	जनता मावि वासकोट २ कोठा निर्माण वडा नं .५	१६००	१६००	१६००	१००.००	१००.००
३	सरस्वती मावि ओवाङ २ कोठा वडा नं. ५	१६००	१६००	१६००	१००.००	१००.००
४	भूमेथान आ वि कोलफेद २ कोठा निर्माण वडा नं.३	१६००	१६००	१६००	१००.००	१००.००
५	ने.रा.प्रा.वि. टारी २ कोठा निर्माण वडा नं. ४	१६००	१६००	१६००	१००.००	१००.००
६	त्रिवेणी प्रा.वि.वासखोला २ कोठा निर्माण वडा नं ८	१६००	१६००	१६००	१००.००	१००.००
७	जनता मावि भौतिक पूर्वाधार निर्माण	१५०००	१५०००	१३५८६.६	९०.५८	९०.५८
	जम्मा	२६२००	२६२००	२४७८६.६	९८.६५	९८.६५

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

संघीय सरकारको विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फका योजनाहरू

ख. आइसीटी, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय निर्माण तर्फ

क्र.स.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	सम्झौता भएको रकम	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	वाल विद्या मावि मरन्ठाना आइ.सी.टी. निर्माण वडा नं ९	६५०	६५०	६५०.००	१००.००	१००.००
२	जनता मावि वासकोट विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण वडा नं. ५	६५०	६५०	६५०.००	१००.००	१००.००
३	मुक्ति मावि रातामाटा पुस्तकालय निर्माण वडा नं. ३	६५०	६५०	६५०.००	१००.००	१००.००
	जम्मा	१९५०	१९५०	१९५०.००	१००.००	१००.००

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

संघीय सरकारको विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फका योजनाहरू

ग. वास सहितको शौचालय निर्माण

क.स.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	सम्झौता भएको रकम	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	जनता मावि वास्कोट वडा नं ५	७००	७००	७००	१००.००	१००.००
२	जनक प्रा.वि. ओखरकोट वडा नं ३	७००	७००	७००	१००.००	१००.००
३	जगदम्वा प्रावि भित्रीकोट वडा नं. ६	७००	७००	७००	१००.००	१००.००
४	धर्मावति मा.वि. पुर्न निर्माण	१५००	१५००	१५००	१००.००	१००.००
	जम्मा	३६००	३६००	३६००	१००.००	१००.००

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

संघीय सरकारको विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फका योजनाहरू

क्र.स.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	सम्झौता भएको रकम	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुका लागि स्यानिटरी प्याड खरिद	२४१४	१५४६.९६	१५४६.९६	१००	१००
	जम्मा	२४१४	१५४६.९६	१५४६.९६	६४.०८	६४.०८

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

शिक्षा सम्बन्धि अन्य विवरण

जम्मा विद्यार्थी भर्ना संख्या : ११९१०

विद्यार्थी पुरस्कृत संख्या : ३२

विद्यार्थी भर्ना शुल्क फिर्ता संख्या : ११०३२

शिक्षक दरबन्दी थप संख्या : ७४

विद्यालय पुरस्कृत संख्या : ४

शिक्षक पुरस्कृत संख्या : १७

पुरस्कृत विद्यालय कर्मचारी संख्या : ३

जम्मा पुरस्कृत हुनेको संख्या : ३२

प्र.अ. पुरस्कृत संख्या : २

बालविकास पुरस्कृत संख्या : २

पुरस्कृत विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी संख्या : ४

नगरपालिकाबाट थप शिक्षक दरबन्दी

मा.वि. : ९

नि.मा.वि. : १७

प्रा.वि. ४३

बालविकास : ४

जम्मा : ७४

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५३ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा प्यू.न.पा. ७ स्थित कभर्डहलमा आयोजित कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

निःशुल्क शिक्षा अन्तरगत अबिभावकहरूलाई विद्यार्थीहरूको भर्ना शुल्क फिर्ता

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

निःशुल्क शिक्षा अन्तरगत अबिभावकहरूलाई विद्यार्थीहरूको भर्ना शुल्क फिर्ता

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५३ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा प्यू.न.पा. ७ स्थित कभर्डहलमा आयोजित कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाले विभिन्न अवसरमा आयोजना गरेका खेलकूद सम्बन्धि गतिविधीको झलक

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाले विभिन्न अवसरमा आयोजना गरेका खेलकूद सम्बन्धि गतिविधीहरूको झलक

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाले विभिन्न अवसरमा आयोजना गरेका खेलकूद सम्बन्धि गतिविधीको झलक

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम तर्फको आधारभूत स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम तर्फका आयोजनाहरू

क्र.स.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम हजारमा	संझौता रकम रु. हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	दाखाक्वाडी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं.२	३८००	३२३५.७९४	१५७९	४८.८१	४८.८१
२	ढाडमंग्रा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं.४	६२००	५४४९.४७०	२७२९	५०.०८	५०.०८
३	ढाँडचौर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र टिकुरी वडा नं.७	३८००.००	२४०६.१८	०	०.००	०.००
४	मरन्ठानाकोट आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं.१०	३८००.००	२५३०.१७	०	०.००	०.००
५	जुम्रीकाडा खोपकेन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन	३७७.००	३७७.००	३७७.००	१००.००	१००.००
६	मरन्ठाना खोपकेन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन	३७७.००	३७७.००	३७७	१००.००	१००.००
	जम्मा	१८३५४.००	१४३७५.६१	५०६३	४९.८२	४९.८२

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ को कृषि शाखा तर्फको साना सिंचाई योजनाहरू

क.स.	संस्था/समूह/फर्मको नाम	ठेगानान	आयोजनाको नाम	कृषकको नाम	रकम अनुदान	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	प्रकृति कृषक समूह	प्यू.न.पा. ७	प्लाष्टिक पोखरी	देवा पोखेल	३००००	०	०	०
२	बिजयनगर महिला सा.कि. सहकारी	प्यू.न.पा. ३	सिंचाई कुलो मर्मत	सर्मिला रावत	७००००	७००००	१००	१००
३	गोविन्द पशु, पन्छि तथा कृषि फर्म	प्यू.न.पा. २	लिफ्ट सिंचाई प्लाष्टिक पोखरी	गोविन्द पछाई	५००००	५००००	१००	१००
४	लघु फुलवारी IPM कृषक समूह	प्यू.न.पा. ८	प्लाष्टिक पोखरी तथा पाईप	रेखा बसेल	३००००	३००००	१००	१००
५	सुनौलो कृषि सहकारी	प्यू.न.पा. १	कुलो मर्मत	थम्मन खड्का	९००००	९००००	१००	१००
६	जनसेवा महिला कृषि समूह	प्यू.न.पा. ८	लिफ्ट सिंचाई (मोटर)	लक्ष्मी पण्डित (क)	३००००	३००००	१००	१००
७	अमिल्या रह माझी समूह	प्यू.न.पा. ३	पक्कि पोखरी निर्माण	सिता रोका	३००००	३००००	१००	१००
८	बागेश्वरी महिला बहु उद्देश्यीय सहकारी संस्था	प्यू.न.पा. १०	कुलो मर्मत	बालाराम गिरी	९००००	९००००	१००	१००
९	गतिशिल कृषि फर्म	प्यू.न.पा. ६	सिंचाई पोखरी मर्मत	हिरा बहादुर भण्डारी	३००००	३००००	१००	१००
	जम्मा				४५००००	४२००००	८८.८९	८८.८९

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा ससर्त अनुदान तर्फको साना सिंचाई योजनाहरू

क्र.स.	संस्था/समूह/फर्मको नाम	ठेगानान	आयोजनाको नाम	कृषकको नाम	रकम अनुदान	खर्च रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	प्यूठान तरकारी तथा कृषि फर्म	प्यू.न.पा. ४	सिंचाई कुलो मर्मत	सन्तोष नेपाली	४००००	४००००	१००	१००
२	साना पोखरी कृषक समूह	प्यू.न.पा. ४	प्लाष्टिक पोखरी	सुजा घर्ति मगर	८००००	८००००	१००	१००
३	बडारा सारिवांग सिंचाई कुलो	प्यू.न.पा. १०	कुलो निर्माण एवं मर्मत	छविराम पराजुली	८००००	८००००	१००	१००
४	भुमेश्वरी मिलिजुली कृषक समूह	प्यू.न.पा. ९	पक्की पोखरी	लक्ष्मी कुमारी गिरी	७००००	७००००	१००	१००
५	चान्जा टोड्के बाखा तथा स्याउ खेती	प्यू.न.पा. ५	प्लाष्टिक पोखरी	किम बहादुर घर्ति क्षेत्री	३००००	३००००	१००	१००
६	नव ज्योति कृषक समूह	प्यू.न.पा. १०	ठुला खेत सिंचाई कुलो मर्मत	माधव प्रसाद पराजुली	१०००००	१०००००	१००	१००
७	प्रगतिशिल कृषक समूह	प्यू.न.पा. ८	बगर कुलो सिंचाई मर्मत	पवित्रा गिरी	५००००	५००००	१००	१००
८	लिश्ने IPM कृषक समूह	प्यू.न.पा. ५	सिंचाई कुलो मर्मत	सुनिता भण्डारी	५००००	५००००	१००	१००
	जम्मा				**५०००००**	५०००००	१००	१००

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम (निर्वाचन क्षेत्र विकास) तर्फका आयोजनाहरू

क्र.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट रु हजारमा	सम्झौता रकम रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	धर्मावति मा.वि. लम्छ्याङ्ग नेटा भवन निर्माण प्यूठान न.पा. ६ माझकोट	१०००	९७०	९७०	१००	१००
२	छेपानी खानेपानी आयोजना प्यूठान न.पा. १०	१०००	९७०	९७०	१००	१००
३	नौ कुलो सिंचाई योजना प्यूठान न.पा. १, २, ३	१०००	९७०	९७०	१००	१००
४	सिद्द मा.वि. जुम्रिकाडा विज्ञान प्रयोगशाला प्यूठान न.पा. ५	१०००	९७०	९७०	१००	१००
५	सहिद प्रतिष्ठान प्यूठान न.पा. ४	१०००	९७०	९७०	१००	१००
६	क. उमेश स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण प्यूठान न.पा. ४	५०००	३७४४.३७७	३०८१.८८	८२.३१	८२.३१
	ख. उमेश स्मृति प्रतिष्ठान प्यूठान न.पा. ४ (घटेको रकमबाट)		९०५	८२१.७५५	९०.८०	९०.८०
	जम्मा	१००००	९४९९.३८	८७५३.६	९६.१५८	९६.१५८

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

क्र.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट रु हजारमा	खर्च रकम रु हजारमा	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	चेरनेटा दाखाकोट जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	२९८.०८	२९८.०८	१००	१००
२	प्यूठान नगरपालिका सेपुंगबाट जानकी मा.वि. चितिखोला सम्म जोडने गोरेटो बाटो	३४२.७९	३२८.२७	९५.७६	९५.७६
३	काठेबर जाबुने खोला हुँदै रानीचौर जाने बाटो निर्माण	३४२.७९	३२८.२७	९५.७६	९५.७६
४	हेल्थपोष्ट घारीकुलो मान्द्रेचौर बाटो स्तरोन्नती वडा नं. ३	४४७.१२	४३५.७६	९७.४	९७.४६
५	गोपि घर हुँदै काठेवर कचरेवर मो.वा. प्यू.न.पा. ४	५४४.१	४६४.३१	८५.३३	८५.३४
६	मित्रमणि चोक हल्दिखोला हुदै भित्रिकोट मो.वा. निर्माण	४२४.६६	४१०.८	९६.७३	९६.७४
७	वडा कार्यालय टाकुरा जनता मा.वि. पहुँचमार्ग तथा मो.वा. नि. वडा नं. ५	८५४.९१	८४६.७८	९९.०४	९९.०५
८	दोभान खेलकुद तटबन्ध तथा नाला निर्माण र बृक्षारोपण वडा नं. ५	५६१.६२	५६१.६२	१००	१००
९	स्थानीय मोटरबाटो नाली मर्मत तथा निर्माण योजना	४७६.९३	४७६	९९.८०	९९.८
१०	वडामा रहेका प्रत्येक ऐतिहासिक र सार्वजनिक गोरेटो मर्मत तथा चौपारी मर्मत	८३४.६२	८३४.२८	९९.९५	९९.९६
११	पूर्वकालदेवि चली आएका विभिन्न घारेटो बाटो मर्मत प्यू.न.पा. ८	६२५.९७	६२५.९७	१००	१००
१२	ठूला सिम बन विरे मो.वा. निर्माण	४१८.६२	४१८.४१	९९.९४	९९.९५
१३	सिन्दुरे गैरा खड्का टोल टाकुरा मोटरबाटो निर्माण	३७१.२७	३५७.७१	९६.३४	९६.३५
१४	राउत टोल ढाँड हुदै खलंगा जोडने मो.वा. प्यू.न.पा. १०	३०३.२३	२९८.९१	९८.५७	९८.५७
१५	मजुवा देखि डाङ्गढुङ्गा जाने बाटो मर्मत प्यू.न.पा. १०	७५४.८७	७१२.२	९४.३४	९४.३५
	जम्मा	७६०१.६	७३९७.३	९७.२७	९७.२७

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतका योजनामा काम गर्दै स्थानीय बेरोजगारहरू

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा गरिबसँग विषेश्वर कार्यक्रम अन्तरगतका कार्यक्रमहरू

क्र.स.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट	खर्च रकम	बित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	प्यूठान न.पा. ८ गरिवसँग विशेस्वर सञ्चाल	१,२१,२५०	१,२१,२५०	१००	१००
२	प्रगति, गौमुखी, डाँफे समूह तरकारी विउ विजन खरिद	६०,६२५	६०,६२५	१००	१००
३	सृजनशिल, कालिका, घण्टीशा समूह बाख्रापालन कार्यत्रक्रम	६०,६२५	६०,६२५	१००	१००
	जम्मा	२,४२,५००	२,४२,५००	१००	१००

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

वडा कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका आ.व. २०७६।०७७ मा भुक्तानी भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

सि.नं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	वजेट रू हजारमा	खर्च रू हजारमा	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	विसमुरे खानेपानी निर्माण स्किम नं. २	२	४८५	३८१	७९	७९
२	मर्मत सम्भार (मर्मत कोष) वडा नं. २	२	३३	३३	१००	१००
३	सापडाडा खानेपानी आयोजना	३	५८२	५८२	१००	१००
४	घुर्चौने खानेपानी मर्मत	३	३८८	३८८	१००	१००
५	ठुलासिम कुवापानी सिचाइ कुलो मर्मत	३	२४३	२४३	१००	१००
६	वडाको भिडियो बृत्तचित्र तयार (क्यामरा खरिद)	४	१००	१००	१००	१००
७	सरसफाई तथा ढल निकास संरचना निर्माण अन्तर्गत जुम्री क्षेत्र ढल निकास	४	९७०	९७०	१००	१००
८	वडाभित्रका सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत सुधार (विजुवार भौकादेखि तल्लो बाटो गोरखनाथ मन्दिर फर्निचर हुदैं झोलुङ्गे पुल सम्म मोटरबाटो निर्माण)	४	१९०	१९०	१००	१००
९	लिस्ने भ्यू टावर निर्माण डि.पि.आर.	५	३८८	३८८	१००	१००
१०	टाकुरा लिफ्ट खानेपानी निर्माण	५	७००	७००	१००	१००
११	पार्क तथा उद्यान निर्माण अन्तर्गत झुलेनी पर्यटन क्षेत्र प्रर्वद्धन	६	३००	३००	१००	१००
१२	टाकुरा पाखाडेरा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन	७	६३१	६३१	१००	१००

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

वडा कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका आ.व. २०७६।०७७ मा भुक्तानी भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

सि.नं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	वजेट रू हजारमा	खर्च रू हजारमा	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१३	सत्तरी मिल मुर्दाघाट जाने सिढी निर्माण	७	२००	२००	१००	१००
१४	धर्मावती सिचाइ नहर कुलो मर्मत सम्भार तथा सुधार योजना ०७४/०७५	८	८४६	८४६	१००	१००
१५	वडाका सडक मर्मत	८	९६२	९६२	१००	१००
१६	सरसफाई तथा ढल निकास संरचना निर्माण अन्तर्गत वाग्दुला वजार ढल निकास	८	९००	९००	१००	१००
१७	खानेपानी आयोजना मर्मत तथा पाइप खरिद (१ ठाडोखोला खानेपानी योजना १५००००, २ पाइप खरिद ५००००।)	९	२००	२००	१००	१००
१८	वडा कार्यालय भवन तला थप अन्तर्गत भुमा प्रा. वि. भवन मर्मत	९	२९१	२९१	१००	१००
१९	साठी जगरबोट पचासी सिचाइ कुलो	९	५००	५००	१००	१००
२०	सारीवाङ् नेवा खानेपानी मर्मत	१०	२००	२००	१००	१००
२१	वडाका खानेपानी मर्मत (१पलासेधारा खानेपानी मर्मत २ खरिवोट खा.पा. मिटर प्रणाली निर्माण)	१०	२४९	२४९	१००	१००
२२	वडा तहका मोटरबाटो मर्मत (१ पनारूख दुवीचौर सडक, २ बडहरा हाडीगैरा मोटरबाटो मर्मत)	१०	४७६	३००	६३	६३
२३	खरिवोट स्यालपाखा भुषवाङ् छेपाने सडक मर्मत (मर्मत कोष)	१०	२५०	२५०	१००	१००
	जम्मा		१०,०८३	२५०	९७	९७

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका आ.व. २०७६।०७७ मा भुक्तानी भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

सि.नं.	आयोजनाको नाम	वजेट रू. हजारमा	खर्च रू. हजारमा	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	बाग्दुला फलफुल तथा तरकारी ब्यवस्थापन केन्द्र	५००	५००	१००	१००
२	नदि नियन्त्रण	१,१४३	१,१४३	१००	१००
३	प्रशासकीय भवन कम्पाउण्ड वाल निर्माण	७४८	७४८	१००	१००
४	न.पाको प्रशासनिक भवन निर्माण	१,६७९		०	०
५	ल्याण्ड फिल्ड साइडस्तरोन्नती तथा पहुच मार्ग निर्माण	१,७७५	१,७७५	१००	१००
६	बाल विद्या मा. वि कृषि कलेज पूर्वाधार निर्माण	१,३४०	१,३४०	१००	१००
७	फोहोरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माण	५००	५००	१००	१००
८	भवन निर्माण	१९०	१९०	१००	१००
९	मर्मत कोष (धाइरे पाडावाङ् कुलो मर्मत सम्भार वडा नं. ८ र वाइसधारा मर्मत वडा नं. ९)	९९	९९	१००	१००
१०	जस्ता पाता (सशस्त्र क्याम्प)	१२६	१२६	१००	१००

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका आ.व. २०७६।०७७ मा भुक्तानी भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

सि.नं.	आयोजनाको नाम	वजेट रू हजारमा	खर्च रू हजारमा	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
११	बैठक कक्षमा राउन्डिङ टेवुल	३८४	३६२	९४	९४
१२	प्रशासकीय भवनको आल्मुनियम पार्टेसन	५००	४९७	९९	९९
१३	पर्दा कार्पेट तथा डोरम्याट	३००	३००	१००	१००
१४	प्रशासकीय भवनको सि. सि. क्यामरा तथा इनभोटर जडान	५००	४४०	८८	८८
१५	मित्रमणि चोक देखि झिमरूक पक्की पुल सडक - पहिलो (भिजन निर्माण सेवा)	२१९	२१९	१००	१००
१६	मित्रमणि चोक देखि झिमरूक पक्की पुल सडक -दोस्रो (भिजन निर्माण सेवा)	४०७	४०७	१००	१००
	जम्मा	१०,४१०	६,२५७	९३	९३

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न हुन नसकि आ.व. २०७६।०७७ मा अल्या भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

सि.नं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	वजेट हजारमा	खर्च हजारमा	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	कटेपोखरा खानेपानी मर्मत (मुर्दाघरमा रकमान्तर)	२	१२१		०	०
२	पुच्छारा सिचाई कुलो (मुर्दाघरमा रकमान्तर)	२	२४		०	०
३	साढेखोला ठूलोचौतारा मोटरबाटो निर्माण (मुर्दाघरमा रकमान्तर)	२	९७		०	०
४	आपनेटा बालविकास केन्द्रका लागि घडेरी खारेको मर्मत	३	४८	४८	१००	१००
५	विजवुार पक्की पुल हुदै कार्कीडाँडा, खल·ा मोटरबाटो छेउछाउमा तारजाली लगाउने काम (मर्मत कोष)	४	१०६	१०६	१००	१००
६	उद्योगतर्फ	७	५००	५००	१००	१००
७	डकुमेन्ट्री निर्माण	७	१००	१००	१००	१००
८	भालुवाङ् प्युठान सडक, दुधे आप टिकुरी वसपार्क	७	४००	४००	१००	१००
९	शिव गुफा मन्दिर निर्माण	९	५५	५५	१००	१००
१०	बुढादेवि मरेङ सडक निर्माण	९	४८५	४८५	१००	१००
११	शिव गुफा मन्दिर निर्माण	९	३००	३००	१००	१००
१२	दुध सकलन केन्द्र तथा सामग्री खरिद	१०	२००	२००	१००	१००
१३	खरिवोट खा. पा. मिटर प्रणाली निर्माण	१०	१००		०	०
१४	नगर यातायात सडक गुरूयोजना अध्यावधिक		५००		०	०
	जम्मा		३,०३६	२१९४	६४.२८	६४.२८

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न हुन नसकि आ.व. २०७६।०७७ मा क्रमागत रूपमा संचालन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू

सि.नं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	बजेट हजारमा	खर्च बजेट हजारमा	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	प्रगतिशील बाख्रापालन फर्म खैराकोट	१	८२५	६५८	८०	८०
२	ब्यावसायिक माहुरीपालन पकेट क्षेत्र	६	३६१	३६१	१००	१००
३	माझकोट वडा कार्यालय भवन निर्माण	६	५५०	५०४	९२	९२
४	बुढादेवि मरेङ सडक निर्माण	९	४८६	४८२	९९	९९
५	जि.स. स. समपुरक		१३,०५२	०	०	०
क	इन्द्रेडाँडा खानेपानी योजना	४	१,२७०	१,२७०	१००	१००
ख	धरमपानी लिफ्ट खानेपानी योजना	१०	१,२४०	१,२१२	९८	९८
ग	टाकुरा लिफ्ट खा.पा. वडा नं. ५	५	७००	७००	१००	१००
घ	बडहरा लिफ्ट खानेपानी योजना	१०	१,५८३	१,५८३	१००	१००
ङ	बतासेडाडा खानेपानी योजना	३	५,६५९	३,८५७	६८	६८
च	वडा कार्यालय भवन तला थप	९	२,०६५	२,०६५	१००	१००
६	टाकुरा काप्रेचौर खानेपानी योजना ९	३	५३६	५३६	१००	१००
७	बृहत विजुवार साना शहरी तथा खानेपानी उपभोक्ता समिति		३,८१९	३,६०९	९४	९४
८	धरमपानी लिपिकोट मोटर बाटो		२५०	२५०	१००	१००
	जम्मा		३१,५७०	१७,०८७	८८	८८

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ को आन्तरिक राजश्व तर्फको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स.	राजस्वका स्रोत	वार्षिक लक्ष्य	खुद असुली	प्रगति %	कैफियत
१	सम्पत्ति कर	५,५००,०००	४५,६६,१४४	८३.०२	
२	बहाल कर	८,००,०००	९,७३,३३५.१९	१२१.६७	
३	ब्यवसाय कर	२,५००,०००	२९,०६,३५०	११६.२५	
४	आयस्रोत तथा सम्पत्ति मुल्यांकन सेवा शुल्क	२,५०,०००	२५,८५७.५	१०.३४	
५	नक्सा पास दस्तुर	३,००,०००	५,४८,६५४.२१	१८२.८८	
६	सिफारीस तथा वक्सौनि दस्तुर	१४,००,०००	१७,४९,०८३	१२४.९३	
७	प्राकृतिक श्रोत उपयोग शुल्क (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा)	२५,००,०००	२४,७२,०००	९८.८८	
८	दण्ड जरिवाना	१,५०,०००	१,५९,९३०	१०६.६२	
९	मनोरन्जन कर	२०,०००	०	०.००	
१०	विज्ञापन कर	५८,०००	५८,५६४	१००.९७	

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ को आन्तरिक राजश्व तर्फको वार्षिक प्रगति विवरण क्रमश :

क्र.स.	राजस्वका स्रोत	वार्षिक लक्ष्य	खुद असुली	प्रगति %	कैफियत
११	नाप नक्सा सेवा शुल्क	१,००,०००	६६,९००	६६.९०	
१२	घर अभिलेख शुल्क	३,००,०००	६,३३,५६२.२४	२११.१९	
१३	नक्सा पास निवेदन दस्तुर	५०,०००	७३,३६२.४६	१४६.७२	
१४	अन्य पटके आय	१,००,०००	९४०	०.९४	
१५	अन्य विक्री बोलपत्र र दरभाउपत्र	३,००,०००	१,५९,९११.३३	५३.३०	
१६	हेभि इक्यूवमेन्ट भाडा आय	५०,००,०००	४,१२,९५०	८.२६	
१७	सरसफाई सेवा शुल्क	८,००,०००	०	०.००	
१८	अन्य श्रोत	६,००,०००	३,६३,०४६	६०.५१	
१९	मालपोत रजिष्टेशन राजश्व	८०,००,०००	७८,९२,५११	९८.६६	
	जम्मा रू.	२,८७,२८,०००	२,३०,६३,१०१	८०.२८	

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

समग्र भौतिक प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
१	स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम	सिंचाई	मीटर	९२	९२	१००	
		विज्ञान प्रयोग शाला	वटा	१	१	१००	
		नया	वटा			०	
		मरमत	वटा			०	
		खानेपानी नयाँ	वटा	१	१	१००	
		भवन	वटा	३	३	१००	
२	संघीय सरकार समपुरक अनुदान	खानेपानी	वटा	२	२	८५	
		सडक	कि.मी.	१४.९	९.००	६०	
		नदि नियन्त्रण	मीटर	२३६	२३६	१००	
३	संघीय सरकार बिशेष अनुदान	खानेपानी योजना	वटा	१	१	९५	
४	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	खानेपानी योजना	वटा	२	२	८४	
		खरको छाना विस्थापन	घरधुरी	३६९	४७०	१२७	

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
५	प्रदेश सरकार बिशेष अनुदान	खानेपानी आयोजना	वटा	२	२	९०	
६	प्रदेश भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको समपुरक	शित भण्डार	वटा	१	०	०	
७	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय समपुरक	झिमरुक रंगशाला निर्माण (गणतान्त्रिक खेल मैदान)	वटा	१	१	८०	
८	जि.स.स. समपुरक	खानेपानी आयोजना	वटा	६	६	८५	
		भवन	वटा	१	१	१००	
९	झोलुंगे पुल कार्यक्रम	नयाँ निमार्ण	वटा	१	१	१००	
		नियमित तथा बृहत मर्मत	वटा	९	९	१००	
१०	पूननिर्माण तथा पूनस्थापना कार्यक्रम	साविक गा.वि.स. भवन	वटा	१	१	१००	
११	गरिबसँग विश्वेस्वर कार्यक्रम	मझौला स्तरका सा.पू.योजना	वटा	२	२	१००	
		क्षमता विकास				०	

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
१२	नगरपालिका स्तरीय योजनाहरु	सडक नया ट्र्याक निर्माण	कि.मी.	२	१	५०	
		सडकको चौडाई विस्तार	कि.मी.			०	
		सडकबोर्ड	कि.मी.	२	१.२५	६३	
		ग्याबियन जाली खरीद	वटा	१००	१००	१००	
		फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण	वटा	१	१	१००	
		पार्क तथा उद्यान	वटा	१	१	१००	
		गेट निर्माण	वटा	२	१	५०	
१३	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यँक्रम	सिढि निर्माण	वटा	४	४	१००	
		सडक निर्माण ट्र्याक ओपनिंग	कि.मी.			०	
		गोरेटो निर्माण	कि.मी.	७.०४	९.२५५	१३१	
		अन्य (कच्चि नाला)	कि.मी.	२७.१४	३२.२०५	११९	

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
१४	शिक्षा तर्फ	भवन	वटा	७	७	१००	
		आई.सि.टी.	वटा	३	३	१००	
		शौचालय	वटा	४	४	१००	
		सेनिटरी प्याड	संख्या	३३९७०	३३९७०	१००	
		अन्य				०	
१५	स्वास्थ्य तर्फ	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र	वटा	४	२	५०	
		खोप केन्द्र	वटा	२	२	१००	
		शौचालय	वटा			०	
१६	वडा स्तरीय योजनाहरु	सामुदायिक भवन र बिधालय	वटा	८	८	१००	
		भवन मर्मत	वटा	१०	१०	१००	
		नयाँ भवन निर्माण	वटा			०	
		सिढि निर्माण	मीटर			०	

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
	वडा स्तरीय योजनाहरू	सडक नया ट्र्याक निर्माण	कि.मी.	२४.७६५	२५.७८६	१०४	
		सडकको चौडाई विस्तार	कि.मी.	१२.७७	१४.६८	११५	
		ग्राभेल	कि.मी.	६.१५	५.९४९	९७	
		पक्की नाली	कि.मी.	०.११२	०.१२	१०७	
		कच्ची नाली	कि.मी.	१.५७	१.५७	१००	
		सडकबोर्ड	कि.मी.	५.५	१.२५	२३	
		कल्भर्ट	वटा	२	२	१००	
		फडके पुल	वटा	३	३	१००	
		झोलुंगे पूल	वटा	१	१	१००	
		lसंचाई कुलो मर्मत	वटा	११	११	१००	
		मरमत	कि.मी.	३५	४०	११४	
		खानेपानी योजना	कि.मी.	१६.१३४	१६.५६६	१०३	
		मरमत	वटा	१५	१५	१००	
		पाईप खरीद	कि.मी.	१.९३	१.९३	१००	
		प्रतिक्षालय	वटा	९	९	१००	
		तारजाली	वटा	३	३	१००	
		मन्दिर निर्माण	वटा	६	६	१००	

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ को नव निर्मित कार्यालय भवन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित धर्मावति मा.वि. मा निर्माण भएको भवन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान न.पा. वडा नं. ९ मा जनता आवास कार्यक्रमबाट निर्माण भएको भवन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

सालघारी लिफ्ट खानेपानी योजना

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

बिजुवार बृहत खानेपानी आयोजनाको ईनार

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

स्व. खिम ब. विष्टको स्मृतिमा निर्मित मुर्दाघाट

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यू.न.पा. २ मा निर्माण भएको मुर्दाघाट भवन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाबाट सञ्चालन भईरहेका योजनाहरूको भौतिक अवस्थाको अनुगमन गर्नुहुँदै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भएको खानेपानी योजना

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यू.न.पा. १ मा निर्माण सम्पन्न भएको किटघाट झो.पु.

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

प्यू.न.पा. ४ मा संचालित बड्डाँडा सोलार लिफ्ट खा.पा. आयोजना निर्माणको क्रममा जडान गरिएको सोलार प्यानलहरू

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यू.न.पा. ४ मा संचालित थापडाँडा खा.पा. योजना अन्तरगत निर्माण भएको ईनार

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

विद्यालय भवन अन्तरगत निर्माणाधिन तारबार कार्यको अनुगमन हुँदै

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

बडडाँडा लिफ्ट खा.पा. योजनाको अनुगमन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

बड्हरा लिफ्ट खा.पा. योजनाको अनुगमन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

थापडाँडा खा.पा. आयोजनाको अनुगमन कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

बड्डाँडा लिफ्ट खा.पा. योजनाको अनुगमन कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

माझकोट खा.पा. योजनाको अनुगमन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

फलफूल तथा तरकारी व्यवस्थापन केन्द्र बाग्दुलाको अनुगमन कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यू.न.पा. ९ को योजना अनुगमन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ मा प्यूठान नगरपालिकामा प्राप्त गुनासोहरूको विवरण

क्र.स.	गुनासोको विवरण	समाधान भएको संख्या	समाधान नभएको संख्या	जम्मा गुनासो
१	सूचना माग	१८	१	१९

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान नगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य तर्फको प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण	महिला	पुरुष	जम्मा
१	RDT गरिएको संख्या			२२०२
२	RDT पोजेटिभ			१४१
३	PCR गरिएको संख्या			३७३
४	PCR पोजेटिभ	७	८२	८९
५	क्वारेन्टाइनमा दर्ता भएका संख्या	२९२	२०९१	२३८३
६	जेष्ठ नागिरक उपचार ६० वर्ष माथी	३१७६	४३४४	७५२०
७	विपन्न नागरिक उपचार सिफारिश	११	१५	२६
८	मेरी स्टोप्सको सहकार्यमा गर्भपतन	८५६		८५६
९	मेरी स्टोप्सको सहकार्यमा परिवार नियोजन			१०८३

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कोभिड १९ को प्रभावसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक सामाग्री हस्तान्तरण गर्नुहुँदै नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपति साथमा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनिकरणको लागि पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम ज्यूबाट उपलब्ध गराईएको मास्क हस्तान्तरण गर्नु हुँदै नेकपा जिल्ला सचिव प्रकाश अधिकारी र प्रदेश सदस्य विजय विराज विष्ट

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

यस कार्यालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कर्तव्य पालनको शिलशिलामा कोरोना संक्रमित भई उपचार पश्चात पुनः सेवामा फर्कदा गरिएको सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनिकरण गर्न नेपाली सेनाको सहयोगमा नगरपालिकाबाट झिमरूक खेल मैदानमा तयार गरिएको क्यारेन्टाईन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

यस कार्यालयमा स्थापना गरिएको स्तनपान कक्ष र सोको उद्घाटन गर्नुहुँदै नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपति

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

जुम्रिकाँडामा राहत वितरण कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा

❑ सागर रिजाल

प्युठान, २० साउन । प्युठान नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने भएको छ। नगरक्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुऱ्याउन नगरपालिकाले पाँचौं नगरसभाबाट यो निर्णय पारित गरेको नगर प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो। नगर क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य पहिचान, उपचार तथा सचेतना जगाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको नगरप्रमुख कक्षपतिले बताउनुभयो।

सेवाको सोमवार प्युठान नगरपालिका-३ डाँडागाउँबाट शुभारम्भ गरिएको छ। नगरका १० वटै वडामा यो कार्यक्रम गरिने नगरप्रमुख कक्षपतिले बताउनुभयो। 'ज्येष्ठ नागरिकलाइ विकासको अनुभूति दिलाउन यो सेवा सुचारु गरेका हौं'- नगरप्रमुख कक्षपतिले भन्नुभयो- 'नगरका १० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट यो सेवा प्रवाह गर्छौं। गरिबी तथा जनचेतनाको कमीले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरु स्वास्थ्य संस्था जानुहुन्न। ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा राख्न यो अभियान शुरुवात गरेका हौं।'

बिरामी पता लगाउने अभियान

नगरपालिकाले यो कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकामा कस्ता खालका बिरामीहरु छन् भन्ने थाहा हुने नगरप्रमुख कक्षपतिले बताउनुभयो। स्वास्थ्य अवस्थाको स्थिति, तथ्यांक संकलन, जनताको अवस्था पत्ता लगाइने कक्षपतिले बताउनुभयो। नगरपालिकाले यो सेवा दिनका लागि महिनाको १० दिन छुट्याएको छ। स्वास्थ्य संस्थाको एकजना कर्मचारीलाई दैनिक दुईसय रुपैयाँ भत्ता दिई घरमै सेवा दिन पठाउने छौं'- कक्षपतिले भन्नुभयो- 'कर्मचारी नपुगेमा र दिन नपुगेमा बढाउने योजना छ।'

ज्येष्ठ नागरिकसँगै अरु बिरामीलाई पनि स्वास्थ्य सेवा दिइने नगरप्रमुख कक्षपतिले बताउनुभयो। स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गर्न, निजीमा उपचार गराउने बिरामीलाई निःशुल्क औषधिको बारेमा जानकारी दिन यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो।

सेवाको शुभारम्भमा डाँडागाउँकी ६८ वर्षीया शान्तादेवी कुमालको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो। सापडाँडा स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी, नगरप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतको उपस्थितिमा उहाँको स्वास्थ्य जाँच गरिएको हो। जाँचमा कुमालको ब्लड प्रेसर र आँखाको समस्या देखिएको सापडाँडा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज गोविन्दराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई भिटामिन सी, स्वास्थ्य शिक्षा र थप औषधिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्कका लागि अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो।

क्षयरोगका बिरामी बढी

प्युठान नगरपालिका-३ मा क्षयरोगका बिरामी बढी रहेको एक तथ्यांकले बताएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा यस वडामा ३४ जना क्षयरोगका बिरामी भेटिएको सापडाँडा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख गोविन्दराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। डाँडागाउँमा पनि तीनजना क्षयरोगका बिरामी भेटिएका र औषधि उपचार भएको उहाँले बताउनुभयो। औषधि पूरा नखाने, सरसफाइको कमी, खानपानको समस्यालगायतले गर्दा क्षयरोगका बिरामी बढेको उहाँले बताउनुभयो। घरमै दिने सेवाले यस्ता रोगमा कमी ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो। वडा नम्बर तीनमा २० वर्षमुनिका १७ जना गर्भवती रहेको उहाँले बताउनुभयो।

वडाले चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने

प्युठान नगरपालिका वडा नम्बर तीनले वडाका बासिन्दालाई स्वास्थ्य जागरण फैलाउन चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर हमालले बताउनुभयो। वडाबाट यो कार्यक्रमका लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै वडाले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती हुने महिलालाई थप एक हजार रुपैंया दिने निर्णय गरेको छ। पहिलेदेखि पाउँदै आएको दुई हजार आठ सय रुपैयाँमा थप एक हजार दिइने वडाध्यक्ष हमालले बताउनुभयो। ५ नम्बर प्रदेश सरकारले ८४ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगी स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको समयमा प्युठान नगरपालिकाले ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रम जिल्लामै नौलो हो।

समयमै जन्मदर्ता गराए एक हजार

प्युठान/ प्युठान नगरपालिकाले 'हाम्रा सन्तान हाम्रो भविष्य' कार्यक्रमअन्तर्गत जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्ने बालबालिकाको नाममा खाता खोलेर एक हजार जम्मा गरिदिने भएको छ। नगरपालिकाको बालबचत कोषअन्तर्गत कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए।

नगरक्षेत्रमा जन्मिने बालबालिकाको भविष्य उज्यालो बनाउनका लागि नगरको पाँचौं सभाबाट यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए। बच्चा जन्मिएपछि पछिसम्म पनि जन्मदर्ता नगराउने पाइएकाले समयमै दर्ता गराउन र नगरमा यति बालबच्चा छन् भन्ने जानकारी लिनका लागि यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने उनले बताए। जन्मदर्ता गराएर आएपछि मात्र बैंक तथा सहकारीमा एक हजार जम्मा गरिदिने नगरप्रमुख कक्षपतिले बताए।

यस कार्यालयले सञ्चालन गरेको विभिन्न कृयाकलापहरूको बारेमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएका न्यूज कटिङ्गहरू

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्दै प्युठान नगरपालिका

❑ सागर रिजाल

प्युठान, ३ असोज । प्युठानका नौवटा स्थानीय तहमध्ये प्युठान नगरपालिका एक हो । प्युठान नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अरु विकास निर्माणका कार्यसँगै शिक्षालाई प्राथमिकता दिइ अगाडि बढेको छ। प्युठान नगरपालिकाले तीन वर्षको नगर शिक्षा योजना समेत निर्माण गरेको छ । शिक्षालाई विशेषरुपमा प्राथमिकता दिदै अगाडि बढ्न र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि यो योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताउनुभयो ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दै एकदेखि १० कक्षा सम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले यो निर्णय गरेको हो । खासगरी समुदायमा रहेका गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई यो अभियानले साथ दिएको नगरप्रमुख कक्षपतिले बताउनुभयो । जनताको जीवनशैली परिवर्तनसँगै शिक्षाको चेतना फैलाउनका लागि यो कार्यको थालनी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नागर प्रमुख कक्षपतिले भन्नुभयो- 'बालबालिकालाई शिक्षा आर्जनबाट बञ्चित हुने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले अभियान थालिएको हो ।'

विद्यालयहरु सूचना तथा सञ्चारमैत्री बन्ने भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नमूना विद्यालयसँगै १४ र चालु आवमा एक विद्यालय सूचना तथा प्रविधिमैत्री बन्ने प्युठान नगरपालिकाका शाखा अधिकृत नरेन्द्र सुबेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्र सरकारमार्फत चालु आवमा बालविद्या माध्यमिक विद्यालय प्युठान नगरपालिका-९ मरन्ठाना रहेको छ। यो विद्यालयले छ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने छ। त्यस्तै नगरपालिकाले जनता माध्यमिक विद्यालय जुम्रीकाँडा बाँस्कोटमा विज्ञान ल्याब सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि पनि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । र मुक्ति माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिने

गरेको छ। नगरक्षेत्रभित्र यसमार्फत ६१ जनाले मासिक एक हजार भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै नगरपालिकाले सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका परिचालिकालाई पनि मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

अनुदानमा शिक्षक

नगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले शिक्षक कमी भएका विद्यालयमा अनुदानमा शिक्षक राखेको छ। गत वर्षदेखि नै अनुदानमा शिक्षक राखिएको नगरप्रमुख कक्षपतिले बताउनुभयो । नगरपालिकाले चालु आवमा शिक्षक अनुदानका लागि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दरबन्दी कम भएका विद्यालयमा अनुदानका शिक्षक राखिने नगरप्रमुख कक्षपतिले

नगरपालिका क्षेत्रभित्र भर्ना भएका एक कक्षादेखि १० कक्षासम्मका १० हजार विद्यार्थीबाट नयाँ शैक्षिक सत्रमा लिएको शुल्क फिर्ता लिने भएको छ । नगरपालिकामा रहेका ५२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा उठेको जम्मा ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिने नगरप्रमुख कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो । शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुका साथै शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन यो कार्यलाई निरन्तरता दिन नगरपालिका लागिपरेको नगरप्रमुख कक्षपतिको भनाइ छ। अब आउने दिनमा कुनै पनि बालबालिका शिक्षा आर्जनबाट टाढा नहुने अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको छ। विद्यालयले उठाएको शुल्कलाई शिक्षाको अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तर बढाउने तथा विद्यालयहरुलाई अनुदानका रुपमा दिने नगरपालिकाको योजना रहेको नगरप्रमुख कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो । रकम फिर्ता कार्य नगरपालिकाले दशैंसम्म गर्ने बताएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री बन्दै विद्यालय

नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका

भएको छ। यसका लागि पनि छ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। दशैं भन्दा अगाडि नै नगरसभाबाट कार्यविधि पास गरेर यी विद्यालयमा काम शुरु हुने शाखा अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो ।

केन्द्र सरकारमार्फत नै नगरपालिका भित्र चालु आवमा प्रतिकोठा आठ लाख रुपैयाँको दरले १४ कोठे भवन निर्माण, प्रतिशौचालय सात लाख रुपिँयाका दरले तीनवटा शौचालय निर्माण गरिने छ। त्यस्तै मर्मतका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ १५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

शिक्षकको बिमा

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षक संरक्षणका निम्ति बीमाको समेत अवधारणा अगाडि बढाएको छ। शिक्षक बीमाका लागि चालु आवमा दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको शाखा अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । विद्यालयका कर्मचारीलाई मासिक एक हजार प्रोत्साहन भत्ताको समेत नगरपालिकाले व्यवस्था

बताउनुभयो । यसले सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षाको गुणस्तर राम्रो बनाउने उहाँले बताउनुभयो । आगामी आवमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नियम ल्याउने नगर प्रमुख कक्षपतिले बताउनुभयो । अनुदानमा राखिएका शिक्षकहरुले प्रावि तह १२ हजार, निमावि तह १५ हजार र मावि तह २५ हजार रुपैयाँ मासिक पाउनेछन् ।

नगरपालिका चालु आवमा शिक्षा क्षेत्रमा अरु कार्यक्रम सँगै दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, लेखा व्यवस्थापन तालिम, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तालिम, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई तालिम, शिक्षकलाई तालिम, विद्यार्थी मूल्यांकन, अनुगमनलगायत कार्यक्रमलाई समेत बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाले गएको शिक्षा दिवसमा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, तीन विद्यालयलाई पुरस्कृत गरेको थियो। जुन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले दुई लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यस कार्यालयले सञ्चालन गरेको विभिन्न कृयाकलापहरूको बारेमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएका न्यूज कटिङ्गहरू

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्र.जि.अ. बद्रिनाथ गैह्रेको विदाई कार्यक्रममा मायाँको चिनो प्रदान गर्नु हुँदै
नगर प्रंमुख तथा नगर उप–प्रमुख

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

यस कार्यालयमा सरूवा भई आउनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपेन्द्र
के.सी. को स्वागत गर्नुहुँदै नगर उप–प्रमुख साथमा नगर प्रमुख

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

सरूवा भई जानु भएका शाखा अधिकृत बिनोद खनालको विदाई तथा सरूवा भई आउनु भएका सुनिल कुमार शर्माको स्वागत गर्नुहुँदै नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपति

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

यस कार्यालयका कृषि शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत चेत बहादुर विष्टको विदाई कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कार्यालयबाट अनिवार्य अवकाश हुनु भएका कर्मचारीहरूको विदाई तथा नव नियूक्त हुनु भएका ईन्जिनियरको स्वागत कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

पूर्व गृह राज्य मन्त्री स्व. टंक विष्टसँगै बृक्षारोपण गर्नुहुँदै नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपति

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान नगरपालिकाबाट प्रकाशन भएको पर्यटन पुस्तिका विमोचन तथा शुभ-कामना आदान प्रदान समारोह

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान नगरपालिकाबाट प्रकाशन भएको पर्यटन पुस्तिका विमोचन तथा शुभ-कामना आदान प्रदान समारोह

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका मूख्य कार्यहरू

- ४८ घण्टे आधारभूत मेलमिलापकर्ता उत्पादन तालिम ३० जना ।
- मेलमिलापकर्ता सूचिकरणका लागि आबेदन संकलन ३० जना ।
- आबस्यकता अनुसार न्यायीक समितिको बैठक ।
- लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस निर्दैशिका निर्माण ।
- नियमित परामर्श सेवा प्रदान ।
- दर्ता भएका बिबाद संख्या ५
- मेलमिलाप गरिएको संख्या २
- छलफलको क्रममा रहेको संख्या ३

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

सहज परियोजनाबाट गरिएका कार्यहरू

- डिजिटल बोर्ड मार्फत सूचना प्रसारण ।
- अडियो भिडियो मार्फत न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी नियमित जानकारी ।
- लैंगिक हिसा बिरूद्धको १६ दिने अभियानमा सहयोग ।
- ४८ घण्टे आधारभुत मेलमिलापकर्ता उत्पादन तालिममा समन्वय ।

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

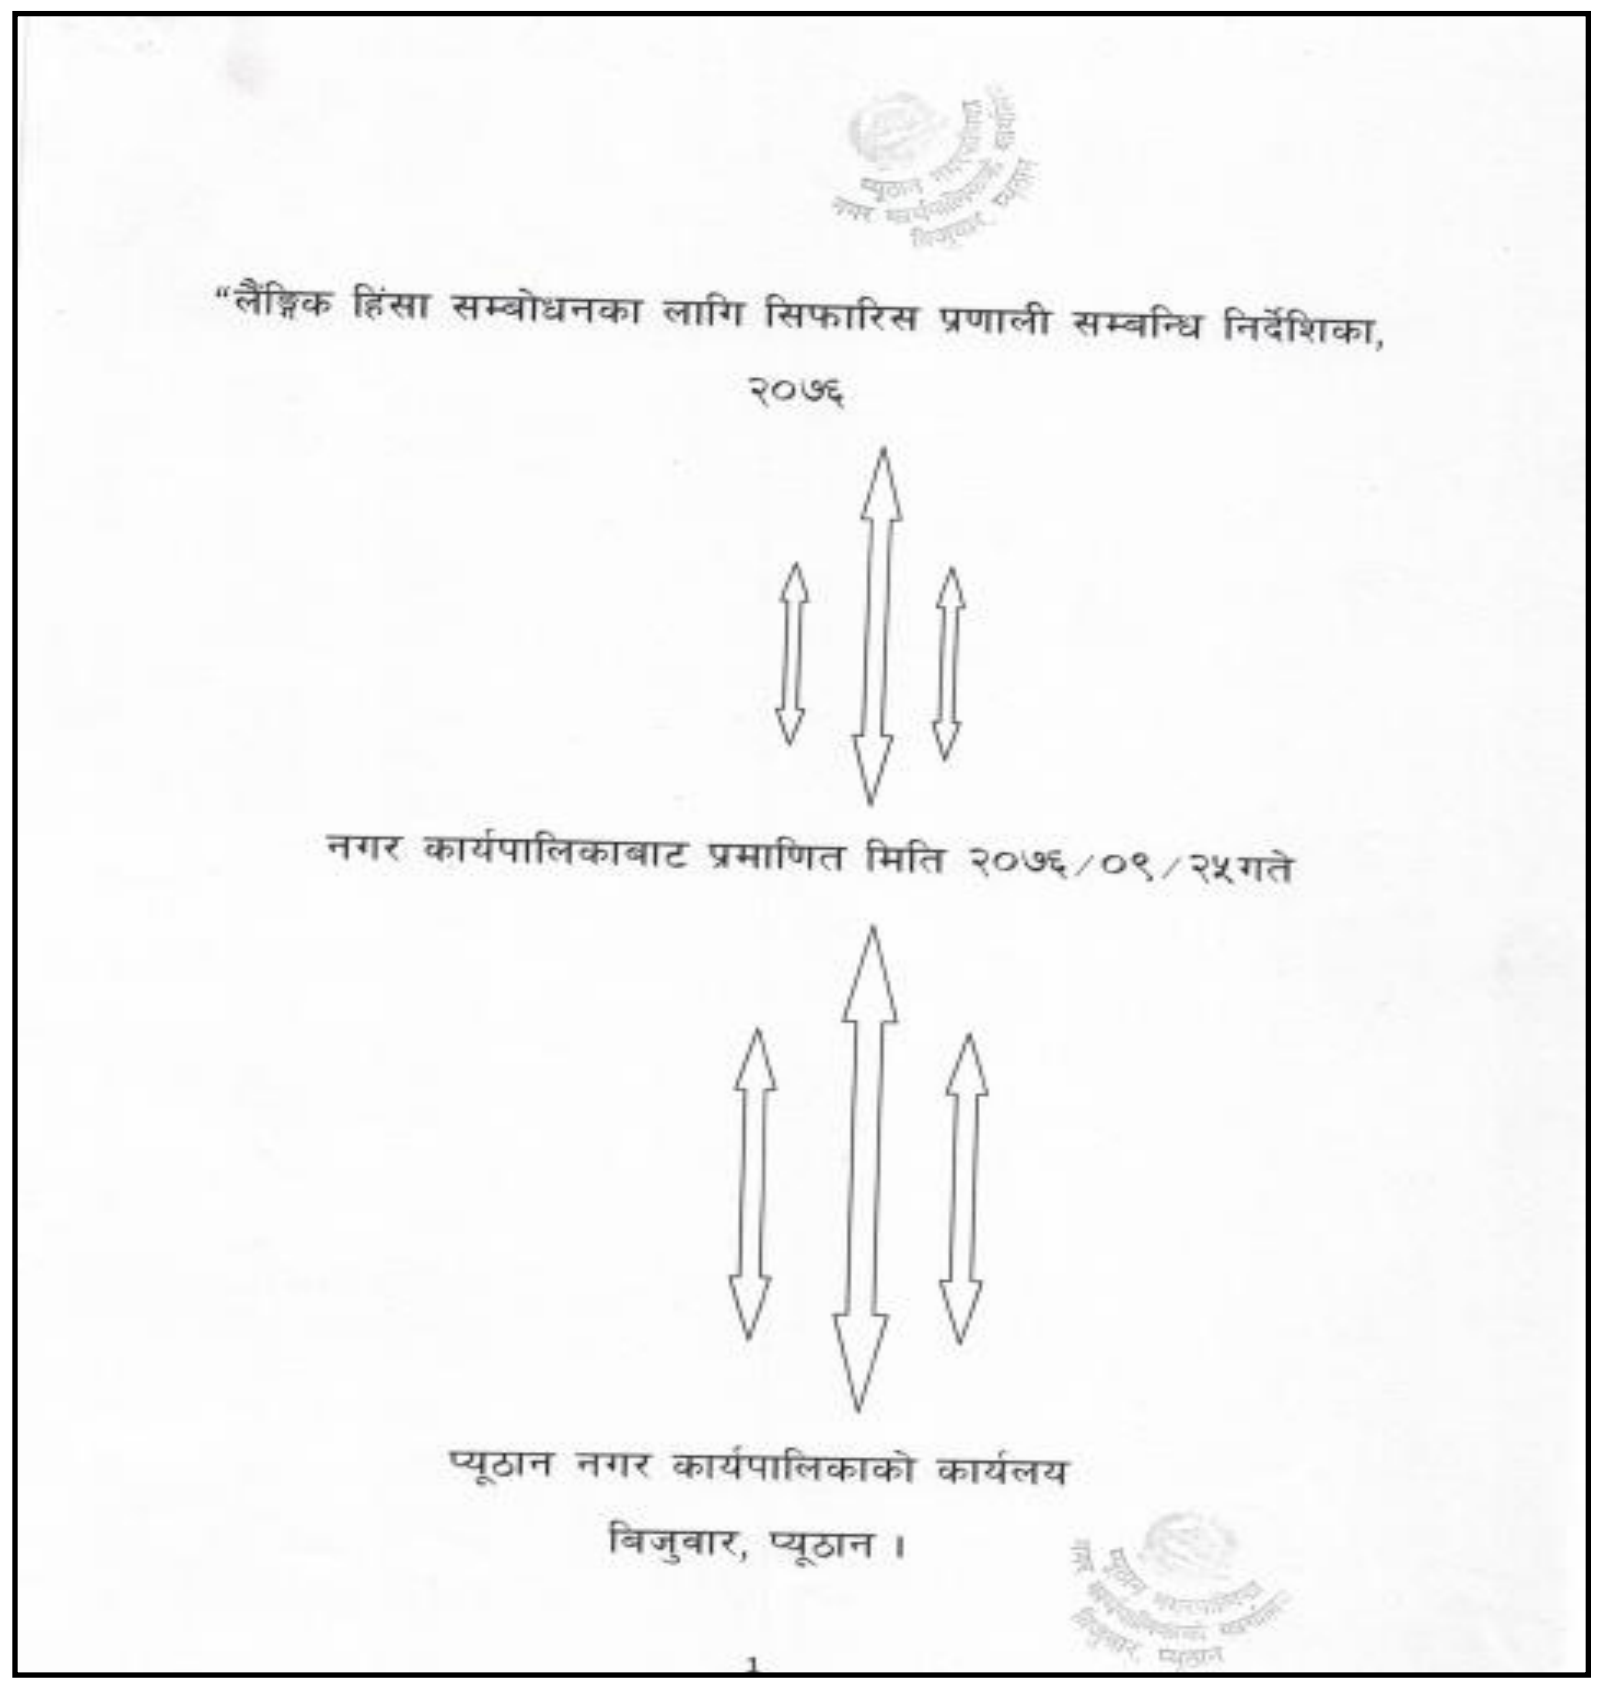

"लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६

नगर कार्यपालिकाबाट प्रमाणित मिति २०७६/०९/२५गते

प्यूठान नगर कार्यपालिकाको कार्यलय

बिजुवार, प्यूठान ।

1

लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनको लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धि निर्दोशिका

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाबाट आयोजित मेलमिलापकर्ता उत्पादन तथा उनिहरूको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

मेलमिलापकर्ताहरूको आधारभूत तालिमका सहजकर्ताहरूलाई मायाँको चिनो प्रदान गर्नुहुँदै नगर उप-प्रमुख शान्ता आचार्य

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

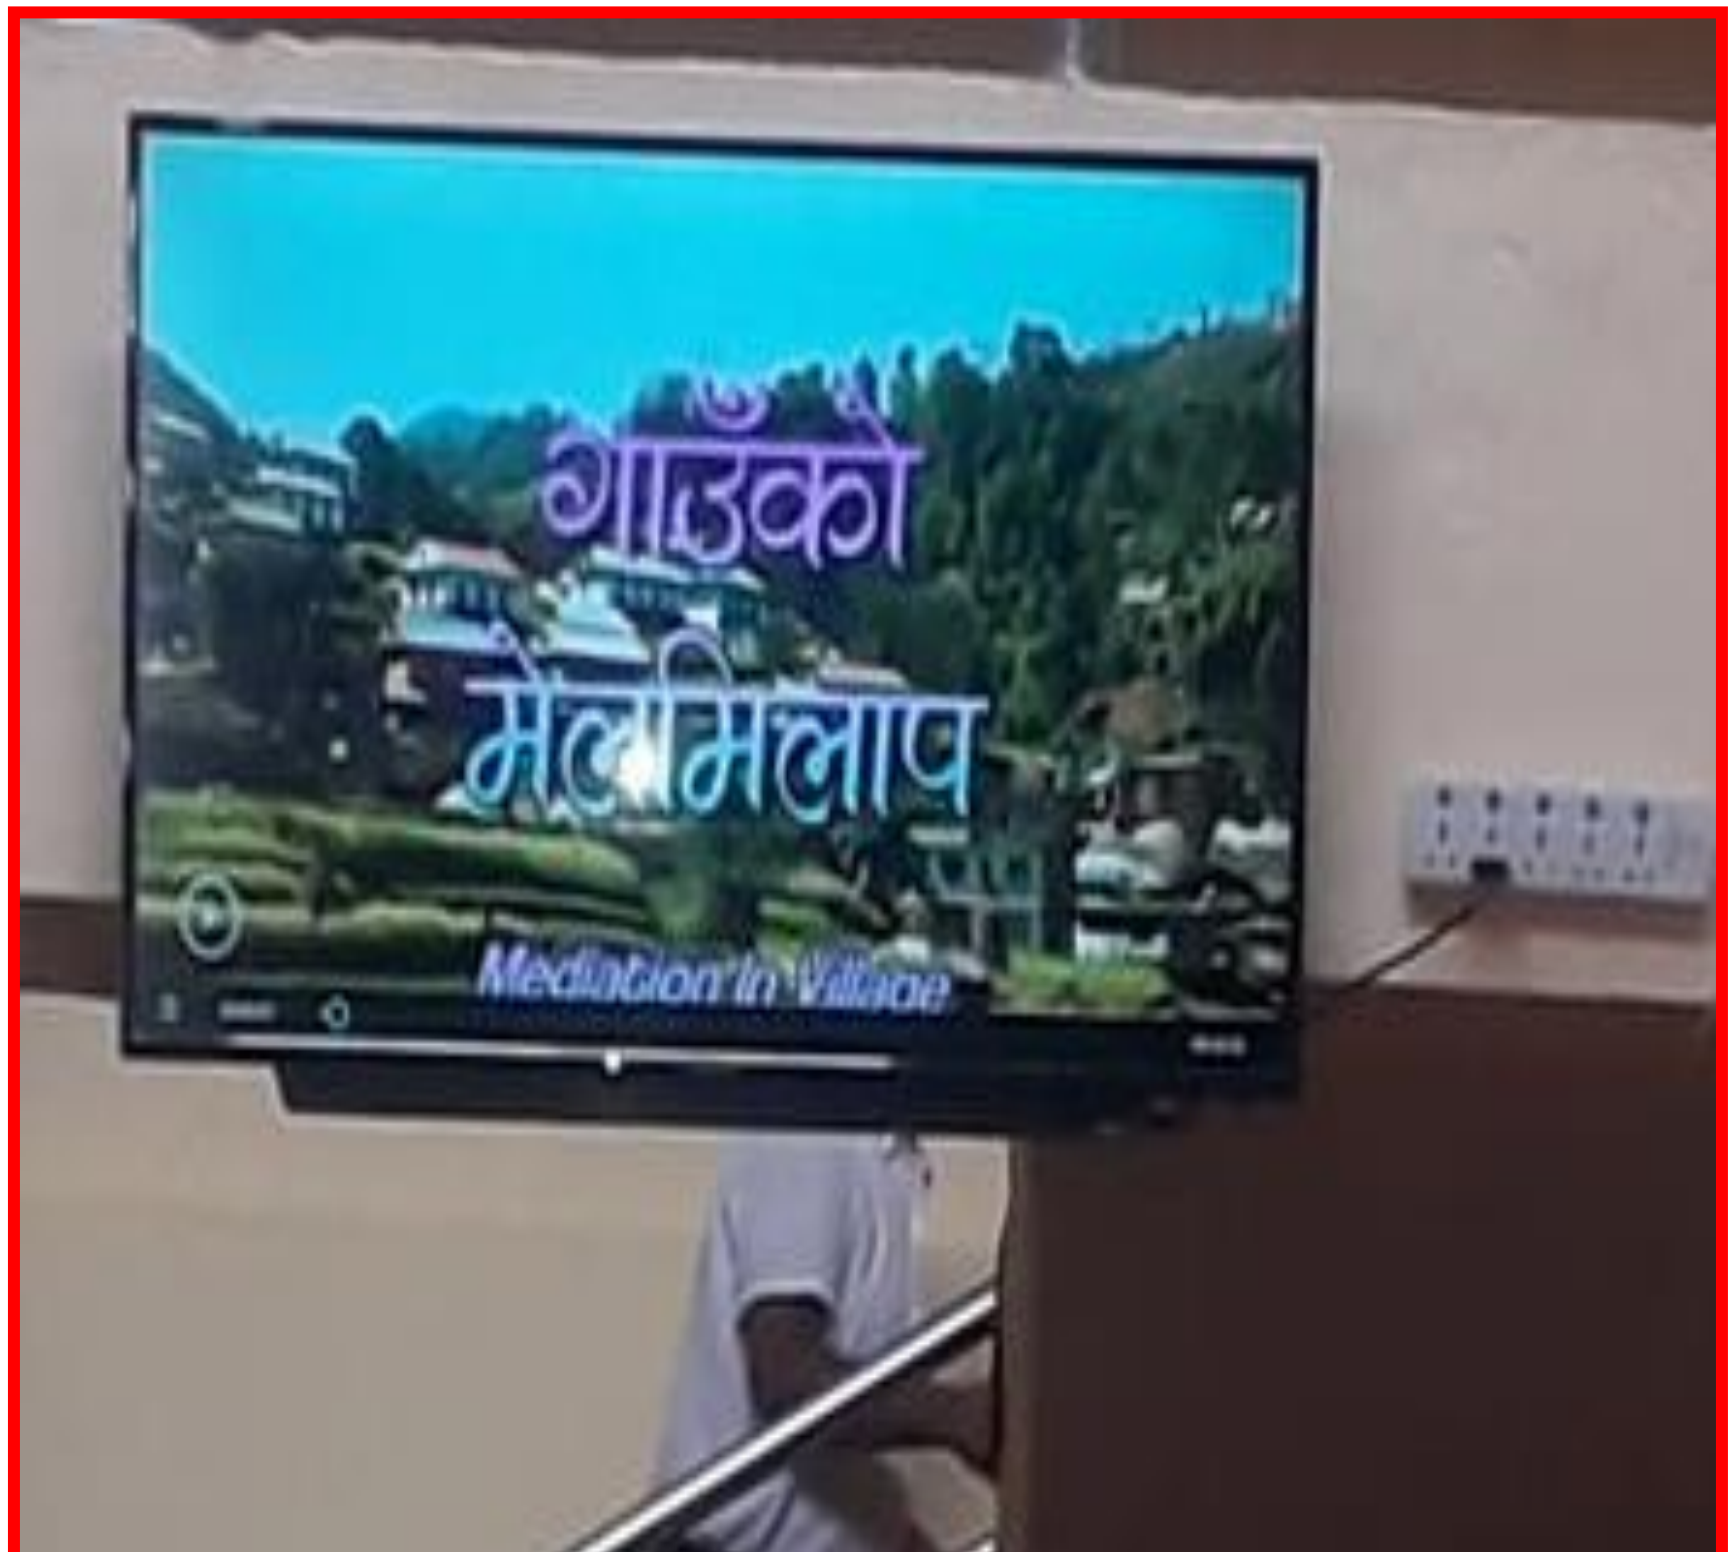

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई अडियो तथा भिडियो माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

अन्तराष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आयोजित नगर स्तरीय प्रभातफेरी कार्यक्रमका झलक

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७६।०७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको झलक

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा नेपाल भ्रमण बर्ष सन् २०२० सम्बन्धि बोर्डहरू लगाउँदै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

विभिन्न लक्षित बर्ग तथा समुदायलाई सामाग्रीहरू हस्तान्तरण हुँदै गर्दाको झलक

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आठौं स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा नगरपालिकाबाट आयोजित कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नगर प्रमुखद्वारा ६० वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई घरमै गएर उपचार गर्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

६० वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई घरमै गई उपचार

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

विश्व स्तनपान सप्ताह २०७६

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

क्षयरोग कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक समिक्षा गोष्ठी

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस २०७६ मा उत्कृष्ठ स्वयंसेविकालाई पुरस्कृत

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस २०७६ मा उत्कृष्ठ स्वयंसेविकालाई पुरस्कृत

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

दादुरा रूवेला खोप अभियान २०७६ को नगर प्रमुख ज्यूबाट शुभारम्भ

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

जिल्ला स्तरीय हेल्पडेस्क दरभान

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

क्वारेन्टाइन स्थल वाग्दुला

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आइसोलेशन स्थलका निको भएका कोरोना संक्रमितहरूलाई नगर प्रमुखबाट विदाई

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नगरपालिकाले गरेका सिर्जनशिल कार्यहरु (Innovative Work)

- रक्त सञ्चार सेवाको लागि सहयोग अनुदान
- एच.आइ.भि. पोजेटिभ विरामीहरूलाई पोषण तथा यातायात खर्च
- ६० वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई घरमै गई उपचार
- ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क आँखा उपचार सेवा
- कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार
- वाह्य खोपकेन्द्र भवन निर्माण
- निःशुल्क गर्भपतन सेवाको लागि अनुदान

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व २०७६/७७ को कृषि तर्फको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम आयोजना कृयाकलापको नाम	लक्ष्य	इकाइ पटक	कार्य प्रगति		कैफियत
१	**तरकारी पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम**					
१.१	८० प्रतिशत छुटमा ६ १२को प्लाष्टिक वितरण	६०	पिस	७२	पिस	
१.२	तरकारी विउ वितरण	१०००	प्याकेट	१२००	प्याकेट	
१.३	५० प्रतिशत छुटमा प्लाष्टिक स्प्रे वितरण	२०	वटा	२४	वटा	
१.४	जैविक विषाधी ल्यूर, ट्रयाप वितरण	५०	वटा	विभिन्न वडाका कृषक हरुलाई वितरण गरियको		
१.५	५० प्रतिशत अनुदानमा क्यारेट वितरण	७५	पिस	१००	वटा	
२	**मसला वाली उत्पादन कार्यक्रम**					
२.१	अदुवा विउ वितरण ७५ प्रतिशत अनुदान	२०००	के.जी.	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
२.२	**वेसार हल्दी विउ वितरण ७५ प्रतिशत अनुदान**	**१५००**	**के.जी.**	**२१००**	**के.जी**	
२.३	प्याजको विउ वितरण अनुदान	१५	के.जी.	१५	के.जी	
२.४	लसुनको विउ वितरण अनुदान	२००	के.जी.	२००	के.जी.	
२.५	विउ उपचार विषाधि वितरण	१	पटक	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
२.६	विउ ढुवानी	१	पटक	१	पटक	

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

सि.नं.	कार्यक्रम आयोजना कृयाकलापको नाम	लक्ष्य	इकाइ पटक	कार्य प्रगति		कैफियत
३	**सुन्तलाजात/सदावहार फुलफुल विकास कार्यक्रम वगैंचा स्थापना सुधार**					
३.१	सुन्तला जात (कागति मौषमी सुन्तला) वेर्ना ४ वटा वगैंचामा	४	वटा	४	वटा	
३.२	सदावहार फलफुल वगैचा स्थापना /सुधार (आँप,लिची)	२	वटा	यस सिर्शकमा रहेको रकम बाट रु ५०००० आप लिची ५० प्रतिशतमा वेर्ना वितरण कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको		
३.३	आँप लिची ५० प्रतिशतमा वेर्ना वितरण कार्यक्रम	१०००	वटा	१८००	वटा	
३.४	सुन्तला जात फलफुल ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण	५०००	वटा	३९००	वटा	
३.५	प्याकिङ चार्ज	१	पटक	१	पटक	
३.६	समस्या निधान अभियान	१	पटक	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
३.७	फलफुल उत्पादन गर्ने किसानलाई ढुवानी अनुदान	१	पटक	१	पटक	

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

सि.नं.	कार्यक्रम आयोजना कृयाकलापको नाम	लक्ष्य	इकाइ	कार्य प्रगति		कैफियत
४	**कृषि यान्त्रीकीकरण अनुदान कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा (टिलर मिनी टिलर थ्रेसर रोटाभटर कर्न सेलर हार्भेस्टर आदी**	२५	थान	१२	थान	
५	**आलु वाली विकास कार्यक्रम**					
५.१	टिपिएस विया वितरणमा अनुदान	१	के.जी.	१	के.जी.	
५.२	प्रिविएस दाना वितरण	१५००	दाना	१५००	दाना	
५.३	वाली संरक्षण सेवा	२	पटक	२	पटक	
६	**खाद्यान्न वालीमा गुणस्तरीय विउ उत्पादन कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदान**					
६.१	धान मुल विउ वितरण	३०	हे.	६	हे	
६.२	मकै वितरण	६०	हे.	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
६.३	गहुँ वितरण	१२	हे.	९	हे	
६.४	५० प्रतिशत अनदानमा त्रिपाल वितरण	१००	वटा	३३	वटा	
६.५	विउ ढुवानी	२	पटक	२	पटक	
६.६	विउको ल्याप टेष्ट फिल्ड अनुगमन	२	पटक	१ पटक		
७	**वाली संरक्षण कार्यक्रम**					
७.१	आकास्मीक वाली संरक्षण सेवा	३	पटक	३	पटक	
७.२	वाल उपचार शिभिर	२	पटक	१ पटक		

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

सि.नं.	कार्यक्रम आयोजना कृयाकलापको नाम	लक्ष्य	इकाइ	कार्य प्रगति		कैफियत
८	**मौरी पालन कार्यक्रम**					
८.१	५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत घार वितरण	७५	वटा	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
८.२	मौरी उपकरण वितरण अनुदान(महदानी, चक्कु, व्रस, पञ्जा, टोपी र झोला)	२१	वटा	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
९	**च्याउ उत्पादन कार्यक्रम**					
९.१	कन्य च्याउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	२०००	प्याकेट	२१००	प्याकेट	
९.२	च्याउ उत्पादन टहरा निर्माण तथा उत्पादन सामाग्री वितरण	१०	वटा	१०	वटा	
९.३	गोत्रे च्याउ उत्पादन प्रर्दशन	१	पटक	१	पटक	
१०	**शीप विकास (जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम)**					
१०.१	तरकारी च्याउ अदुवा वेसार फलफुल स्थलगत तालिम	४	पटक	२	पटक	
१०.२	योजना तर्जुमा गोष्ठी	१	पटक	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
१०.३	अन्तर जिल्ला भ्रमण कृषक/पदाधिकारी (५ दिने)	१	पटक	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
११	**राष्ट्रिय अन्त राष्ट्रिय दिवश उत्सव कार्यक्रम**					
११.१	विश्व खाद्य दिवश	१	पटक	१	पटक	
११.२	विषाधि न्यूनीकरण सप्ताह	१	पटक	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
११.३	राष्ट्रिय धान दिवश	१	पटक	लकडाउनको कारण सम्पन्न हुन नसकेको		
१२	**साना सिंचाइ कार्यक्रम**					
१२.१	प्लाष्टिक पोखरी निर्माण/पाइप खरिद/कुलोमर्मत संभार	५	संख्या	१७	संख्या	ससर्त अनुदान ८ सहित

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कृषि मेला प्रदर्शनी २०७६ मा उत्कृष्ट कृषि उपज प्रशर्दन गर्ने स्थानीय कृषकहरूलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

८०% छुटमा सिल्पौलिन प्लास्टिक वितरण

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

५० % अनुदानमा मिनी टिलर वितरण कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

५० % अनुदानमा मिनी टिलर वितरण कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कृषि मेला प्रदर्शनी

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आँप, लिची, सुन्तला, जुनार तथा कागतीको बेर्ना वितरण

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

यस कार्यालयबाट ३९ औं खाद्य दिवसको अवसरमा आयोजित विद्यालय स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता पश्चातको एक झलक

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

यस कार्यालयबाट ३९ औं खाद्य दिवसको अवसरमा आयोजित र्‍याली कार्यक्रमको एक झलक

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनको कृषि शाखाबाट भएको अनुगमन

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कार्यक्रमको नाम - वित्तिय समानिकरण पशु सेवा प्रसार

बजेट रु हजारमा

क्र स	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	२०७६।०७७ को				
			बार्षिक		वार्षिक प्रगती		
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगति प्रतिशत
	चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरु						
१	व्यवसायिक कार्यक्रम						
१.१	गाइ भैंसि विकास का लागि गोठ निर्माण सुधार	सख्या	२	३००	२	३००	१००
१.२	वाख्रा विकास कार्यक्रमका लागि खोर निर्माण सुधार	सख्या	५	४५०	५	४५०	१००
१.३	वंगुर विकास कार्यक्रम खोर निर्माण सुधार	सख्या	२	१००	२	१००	१००
२	मासु पसल सुधार	सख्या	२	१००	२	१००	१००
३	व्यवसायिक कार्यक्रम अनुगमन	पटक	आ अ				
४	पशु आहारा तथा पोषण सुधार कार्यक्रम						

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

क्र स	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	२०७६।०७७ को				
			बार्षिक		वार्षिक प्रगती		
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगति प्रतिशत
४।१	वरसिम घाँसको विउ वितरण	के जि	४००	१००	४००	१००	
४।२	जै घाँसको विउ वितरण	के जि	५००	५०	५००	१००	
४।३	भेच घाँसको विउ वितरण	के जि	१००	२०	१००	२०	
४.५	डाले घँसको नर्सरी व्यवस्थापन सहयोग	सख्या	१	५०	१	५०	५०
४.६	डाले घाँस विरुवा वितरण	हजार	२०	२००	१०	१००	५०
४.७	मिनरल व्लक वितरण प्रति वडमा १५०० सवै वडमा	हजार	१।५	२२५	७५०	१००	५०
४.८	वाख्राको लागी ७५ प्रतिशत अनुदानमा टाटनो वितरण	सख्या	१०	६०			०

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

क्र स	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	२०७६।०७७ को				
			बार्षिक		वार्षिक प्रगती		
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगति प्रतिशत
६	पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम						
६.१	उपचार सेवा						
६.१.१	मेडिकल उपचार तथा औषधि खरीद	सख्या	१००००	६००	१७२०३	६००	१००
६.१.२	सर्जिकल उपचार सेवा तथा औषधि खरिद	सख्या	१०००	१५	११०३	१५	१००
६.१.३	गाइनाकोलोजिकल उपचार तथा औषधि खरिद	पटक	३००	१०	४५१	१०	१००
६.१.४	रोग निदान प्रयोगशाला सेवा	पटक	५००	१५	८९२	१५	१००
६.१.५	पशु स्वास्थ्य शिविर १ दिने संचालन तथा व्यवस्थापन	पटक	३	२४०	२	१५०	१००
६.१.६	विभिन्न आवश्यक खोप खरिद	पटक	१	६०	१	१८	३०
७	मत्स्य विकास कार्यक्रम						
७.१	माछा पोखरी निर्माण सुधार सहयोग	पटक	१	१५०			०
७.२	माछा भुरा ढुवानि अनुदान	पटक	आ अ	६०			०
	चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमको जम्मा			२८०५		२२२८	१०८०

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कार्यक्रमको नाम - शशर्त अनुदान

क्र स	कार्यक्रमको नाम	खर्च शिर्षक	इकाइ	२०७६।०७७ को				
				बार्षिक		वार्षिक प्रगती		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगति
	चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरु							
क	शशर्त अनुदान							
१	पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण सेवा तथा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम ३१२०२१०२	३१२०२१०२						
१.१	विभन्न खोप लगाय वापत भ्याक्सिनेटरहरु लाइ पारीश्रमिक	२।७।१८।४	पटक	१	१२५	१	२७।५	१००
२.०	पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागी औषधि खरिद	२।७।१८।५	पटक	१	१४५	१	१४५	१००

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

क्र स	कार्यक्रमको नाम	खर्च शिर्षक	इकाइ	बार्षिक		वार्षिक प्रगती		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगति
३	वर्डफ्लु रोग लगायत अन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागी वैठक तथा नुमुना संकलन गरी प्रदेश तथा संघमा रिपोर्टिङ गर्ने	२।७।१८।६	पटक	३	७५			
४	पशु पन्छि तथा मत्स्य उपचार सेवा	२।७।१८।७	पटक	१	६०	१	६०	१००
ख	पशु पन्छि श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यक्रम	३१२०२१०३						
१.०	तरल नाइट्रोजन ढुवानी भणडारण वितरण तथा व्यवस्थापन	२।७।१८।३	पटक	१२	२४०	१	२४०	१००
१।१	कृतिम गर्भाधान गाइ		सख्या	आ अ		२४१		
१।२	कृतिम गर्भाधान भैंसी			आ अ		९२		
	कुल जम्मा				६४५	३३३	४४५	

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

महिला तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

सि.न.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रकम	खर्च रकम
	महिला तर्फ		
१	दिवशिय कार्यक्रम	१०००००	०
२	तीज गित प्रतियोगिता	१०००००	९७०५०
३	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियान अन्तर्गत अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम	३०००००	१२५१२०
४	महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम अन्तरपार्टी महिला संजाल	२०००००	०
५	महिला सहकारीका पदाधिकारीहरुलाइ ५ दिने सहकारी व्यवस्थापन तालिम	१३००००	१२९९१०
६	महिला सहकारी संस्थाहरुलाई ७ दिने लेखा ब्यवस्थापनतालिम	१७००००	१६९९६०
७	सीपविकास तथाप्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम	५००००	०
८	महिला सहकारीहरु विच चौमासिक अर्न्तक्रिया कार्यक्रम	३००००	०
९	संजाल बैठक तथा ब्यवस्थापनखर्च	६००००	३८०२०
१०	नगर स्तरिय महिला संजाल र अन्तरपार्टी महिला संजाल सदस्यहरुलाई अन्तर जिल्ला भ्रमण	२६००००	१९७००
११	लैंङ्गिक हिंसा पिडित उद्धार कोष	२०००००	०
	जम्मा	१६०००००	५७९७६०

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

बालबालिका तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

सि.न.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रकम	खर्च रकम
१	बालक्लव तथा बाल संजाल गठन तथा व्यवस्थापन	५००००	३८५१५
२	बालवालिकाहरुको नगर स्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता	१९००००	०
३	बालविवाह विरुद्ध अभियान	१०००००	०
४	नगरतथा वडा स्तरियबाल संजाल बैठक	६००००	२७४००
५	बाल मैत्रि सूचकहरुको सर्वेक्षण तथा बाल मैत्रि घोषणा	४०००००	०
६	बालबालिका दिवशिय कार्यक्रम	५००००	३५५०५
७	नगर स्तरिय बाल भेला	५००००	०
८	वडा स्तरिय बाल संरक्षण समिति तथा बाल मैत्रि स्थानीयशासन समितिको बैठक	६००००	०
९	नगरपालिका स्तरिय बाल मैत्रि स्थानीयशासन समितिको बैठक व्यवस्थापन	५००००	०
१०	बालश्रम तथाबालदुर्व्यवहार विरुद्ध अन्तर्क्रियाकार्यक्रम	४००००	०
११	बालकोष	५००००	०
१२	कीशोर किशोरी अन्तरकृयात्मक छलफल तथा जिवनउपयोगी सीपविकास तालीम	१०००००	०
१३	बाल वचत योजना	८०००००	८५०००
	जम्मा	२००००००	१८६४२०

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

जेष्ठ नागरिक तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

सि.न.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रकम	खर्च रकम
१	दिवशियकार्यक्रम	३००००	३००००
२	संजाल बैठक ब्यवस्थापन	४००००	३१२४५
३	सरोकारबाला विच अर्न्तक्रिया कार्यक्रम	२००००	०
४	जेष्ठ नागरीक सम्मानकार्यक्रम	४०००००	३६००००
५	अर्न्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम	८००००	०
६	जेष्ठ नागरिकहरुको भ्रमण	१५००००	०
७	जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम	५००००	४९४४०
८	वडा स्तरिय संजाल गठन	३००००	२९६२५
९	विश्व अल्जाइमर दिवश	०	८०००
१०	जेष्ठ नागरिक आँखा उपचार	८०००००	८०००००
	जम्मा	१६०००००	१३०८३१०

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

अपांग तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

सि.न.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रकम	खर्च रकम
१	दिवसिय कार्यक्रम	३००००	२३४०५
२	ग र घ बर्गको परिचयपत्र पाएका अपाङ्गता भएकाब्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता	५०००००	३६४०००
३	वडा तथा नगर स्तरिय संजाल बैठक ब्यवस्थापन	७००००	२६७८०
४	अपांग कोष	१०००००	०
५	सम्मान कार्यक्रम	१०००००	०
	जम्मा	८०००००	४१४१८५

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कार्यक्रम संचालन गर्दा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

- यस नगरपालिका अन्तर्गत सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू, नगरस्तरीय संजालहरू र सम्वन्धित वडाहरूको सहयोग र समन्वयमा संचालन गरेको हुँदा कुनै पनि समस्याहरू आएका थिएनन् । तर स्थानिय उप-निर्वाचन र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ रोगको कारणले यस नगरपालिका अन्तर्गत पनि केहि कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेनन् ।

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

लेखा व्यवस्थापन तालिम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

२५ औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

कार्यालयबाट आयोजित नगर स्तरीय तीज गित तथा नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

दिवस तथा समारोह

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

वडास्तरीय जेष्ठ नागरिक सञ्जाल गठन

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

अपांग तथा असहायलाई सहयोग वितरण

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

अपांगहरूका लागि अपांग सेवा संघलाई सहायक सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

यस कार्यालबाट सञ्चालन भएको बाल बचत योजना कार्यान्वयनका लागि न.पा. र ने.बै.लि. विचको सम्भौता

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

आ. व. २०७६।०७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन

क्र सं.	सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समुह	वार्षिक			
		कायम सङ्ख्या	रकम	वितरण गरेको सङ्ख्या	वितरण गरेको रकम
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	२५०५	१,९८,७८,०००	२३७१	१,८८,००,०००
२	जेष्ठ नागरिक दलित	१८७९	१,४९,६२,०००	१७४६	१,३९,१२,०००
३	एकल महिला	११	८८,०००	९	६८,०००
४	विधुवा महिला	४०६४	३,२४,६६,०००	३८८२	३,१०,२४,०००
५	पूर्ण अपाङ्ग	१११	१३,३२,०००	१०९	१३,०८,०००
६	अति अशक्त अपाङ्ग	५३९	३४,४४,८००	४७५	३०,४०,०००
७	दलित बालबालिका	२६०८	४०,३६,०००	२१६५	३३,६८,४००
८	उपचार खर्च	३९१२	१५,५२८,०००	३६६४	१,४५,८८,०००
	जम्मा	**११७१७**	**९,१७,३४,८००।-**	**१०७५७**	**८,६१,०८,४००।-**

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ. व. २०७६।०७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन

क्र सं.	सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समुह	वार्षिक			
		कायम सङ्ख्या	रकम	वितरण गरेको सङ्ख्या	वितरण गरेको रकम
१	जेष्ठ नागरिक (७० वर्षमाथि)	७३९	८४,९६,०००	६८६	८१,९९,०००
२	जेष्ठ नागरिक दलित	२२७	१८,०६,०००	२०६	१७,१२,०००
३	जेष्ठ नागरिक एकल	२४६	१९,७१,०००	२२५	१८,०३,०००
४	विधुवा (आर्थिक सहायता)	४०२	३२,१६,०००	३८०	३१,३२,०००
५	क वर्ग	२५	३,००,०००	२५	३,००,०००
६	ख वर्ग (आर्थिक सहायता)	१०६	६,७८,४००	९९	६,३३,६००
७	दलित बालबालिका	४८७	७,६४,८००	४४६	६,८९,६००
	जम्मा	**२२३२**	**१,७२,३२,२००।-**	**२०६७**	**१,६४,६९,२००।-**

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

२०७६ साल बैशाख देखि चैत्रसम्म वार्षिक व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

जन्म				मृत्यु				विवाह	बसाइसराइ				सम्बन्ध विच्छेद
महिला	पुरुष	अन्य	जम्मा	महिला	पुरुष	अन्य	जम्मा	जोडी	आएको दर्ता संख्या	आएको सदस्य संख्या	गएको दर्ता संख्या	गएको सदस्य संख्या	
१०३२	१०३९	०	२०७१	१५१	२१८	०	३६९	४६५	५४	१९१	७१	२५५	०

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

संविधान दिवसको अवसरमा जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा उपचार भई रहेका विरामीहरूलाई फलफूल वितरण कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

दुर्गममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रबृत्ति प्रदान तथा राहत वितरण कार्यक्रम

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

नवलपरासीको अन्तरपालिका भ्रमण टोलीको स्वागत पश्चातको सामुहिक फोटो

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

प्यूठान नगरपालिकाको आठौं नगरसभाको अवसरमा लिईएका तस्विरहरू

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

आ.व. २०७७।०७८ को अख्तियारी सुम्पिनु हुँदै नगर प्रमुख, ग्रहण गर्नुहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

सिकाई

- नियमित सुपरभिजन नुहँदा शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्ती र गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको ।
- स्थानीय स्तरमा उपभोक्तासँग आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नभएका कारण निर्माण कार्यमा कठिनाई भएको ।
- बजेट अनुसार लागत अनुमान नभई लागत अनुमान पश्चात बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- परिमाणमुखी भन्दा गुणस्तर तथा दिगोपानामा जोड दिनुपर्ने ।
- वडाहरूका योजनाहरू संख्यात्मक भन्दा थोरै तर गुणस्तरीय हुनुपर्ने ।
- स्थानीय स्तरमा रोजगारमूलक तथा श्रममूलक ढंगले योजना संचालनमा ल्याउनुपर्ने ।
- प्राविधिक तथा उपभोक्ताको बीचमा समन्वय भई कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।
- अनुगमन कम्तिमा एक योजनाको लागि दुई पटक गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समितिको लागि योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम आवश्यक भएको ।

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

मुख्य उपलब्धीहरू

⊕नगरपालिकाको आ.व. २०७६।०७७ मा पूर्वाधार तर्फको स्वीकृत कार्यक्रम तर्फको भौतिक प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र वित्तिय तर्फ ८१.६६ प्रगति हासिल ।

⊕पूर्वाधार तर्फको २८५ योजना स्वीकृत भएकोमा कोभिड-१९ को प्रतिकुल अवस्थामा पनि २५६ वटा सम्पन्न भएको र २७ वटा क्रमागत रहेको र २ वटा योजना सम्झौता नभएको ।

⊕यस आ.व. मा ३.६९ कि.मी. नयाँ ट्र्याक निर्माण भई थप सडक सञ्जाल जोडिएको छ भने १४.६१ कि.मी. सडक चौडाई विस्तार स्ट्रक्चर तथा सुधार कार्य भई नियमित यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको ।

⊕विद्यालय भवन मापदण्ड बमोजिम ७ वटा पक्कि भवन निर्माण भई कक्षा सञ्चालनमा सहजता पुगेको ।

⊕एकघर एक धाराको नीति अनुसार आ.व. २०७६।०७७ मा २९८ घरधुरीलाई प्रत्यक्ष खानेपानी सुविधा पुगेको ।

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

मुख्य उपलब्धीहरू

- ४७० घरधुरीलाई कर्कटपाता वितरण गरी खरको छाना विस्थापित गरिएको ।
- वडा नं. ९ र १० लाई जोड्ने ६ मिटर चौडाई भएको ४।५ कि.मी. चक्रपथ विस्तार भई बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको ।
- भित्रीकोट, शहिद पार्क, खेलकूद मैदानका संरचनाहरू तयार भई आधारशिला खडा भएको र २९ सटरको तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण पश्चात सञ्चालनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको ।
- जुम्रिकाडा, पूर्णागाउँ, थापाडाँडा, बडडाँडा, विषमुरे स्किम नं. २, छेपाने, माझकोटमा खानेपानीका मुख्य संरचना तयार भएका छन् भने मरन्ठानाकोटको निर्माण सामाग्री खरिद भई आ.व. २०७७।०७८ मा सम्पन्न हुनेछ ।
- नगरपालिकाको विभिन्न कृषि सम्बन्धि कार्यक्रमहरूबाट कूल जम्मा ३०४४ जना कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

मुख्य उपलब्धीहरू

- झिम्रुक नदि नियन्त्रणको लागि दाखाक्वाडी र खैरा तर्फ २३६ मिटर नदि नियन्त्रण सम्पन्न भएको ।
- ढाँडमंग्रा र अड्डापाटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण भई सञ्चालनमा आएकोछ ।
- १०० मे.टन क्षमताको शित भण्डार Cold Store निर्माणको लागि सम्झौता सम्पन्न भएकोछ ।
- न.पा. तथा वडाहरूमा प्राविधिक जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थापन भई योजना सम्पन्न गर्नमा सहजता पुगेकोछ ।
- नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र भवन शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयवाट सम्पन्न हुने अबस्थामा रहेको ।
- पशुसेवा कार्यक्रम तर्फ परजिवी नियन्त्रण तथा औषधी वितरण कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, बरसिम, भेच, जैं घाँसको विउ वितरण कृषि सामग्री खरीद कार्य लक्ष्य अनुसार सम्पन्न भएको छ ।

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

मुख्य उपलब्धीहरू

- शैक्षिक शत्र २०७६ मा नगर क्षेत्र भित्रका विद्यालयका आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने ५-१२ वर्ष उमेर समुहका वालवालिकाहरूलाई पूर्ण भर्ना घोषणा कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
- शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री वनाउन शुरूवात गर्ने क्रममा १ वडा १ नमूना विद्यालय छनौट गरिएको छ ।
- शिक्षा दिवसका अवसर उत्कृष्ट शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
- महिला सशक्तिकरण तर्फ महिला समुह, समिति गठन सम्वन्धी अनुशिक्षण सम्पन्न गरिएको छ । १४ वटा महिला सहकारीहरू विच गीत तथा न्यृत्य प्रतिगोगिता सम्पन्न । १३ महिला सहकारीहरूलाई ७ दिने लेखा व्यवस्थापन तालिम तथा नगरस्तरीय महिला संजालको ४ पटक बैठक सम्पन्न गरिएकोछ ।
- विभिन्न जातजातिको संस्कृति र भेषभुषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिका भित्र रहेका आदिवासी जनजातिहरूको भेषभुषा माघी मेला कार्यक्रममा प्रदर्शन गरिएको छ ।

प्यूठान नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बिजुवार, प्यूठान ।

मुख्य उपलब्धीहरू

- वडा स्तरीय जनजाति, दलित र अपांग संजालका बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् ।
- यस नगरपालिकाका ८ वटा वडामा ४७ बालक्लब गठन भई २ पटक बैठक बसेको ।
- बाल बचत योजना अन्तरगत ८५ जना बालकालिकाको खाता खोलि रू. १ हजारको दरले बचत गरिएको ।
- अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा ९० बर्ष माथिका १० जनालाई सम्मान गरिएको साथै अन्य अवसरमा जम्मा ८० जना जेष्ठ नागरिक लाई सम्मान गरिएको छ ।
- आ.व. ०७६/०७७ को कृषि कार्यक्रम तर्फ टिपियस आलुको वियाँ, च्याउ खेती विस्तारका लागि ५० प्रतिशत छुटमा च्याउको विउ, तरकारी करेसावारी कम्पोजिट प्याकेट वितरण, गहुँ उत्पादन कार्यक्रम, नमूना सस्तो नर्सरी तरकारी वाली र वाली संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको साथै माछा भुरा ढुवानी मत्स्य सामग्री र पोखरी निर्माण, पुष्पखेती गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सहयोग गरिएको छ । यस कार्यालयको ८० प्रतिशत अनुदान अन्तरगत जम्मा ७२ किसान र ५० प्रतिशत अनुदान अन्तरगत १०४ जना किसानहरूले लाभ लिएको ।

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

मुख्य उपलब्धीहरू

⊕जेष्ठ नागरिकहरूका लागि प्रदान गरिदै आएको निःशुल्क आँखा शिविर कार्यक्रम र निःशुल्क आँखा उपचारको कार्यक्रम संचालनका लागि नेत्र ज्योति संघको सहकार्यमा ८३४ जना महिला र ७५७ जना पुरूष समेत जम्मा १५९४ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको ।

⊕प्रत्येक विहिवार जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरिने र हालसम्म १८१९ जनालाई र अपांग परिचय पत्र ३७३ जनालाई बितरण गरिएको छ ।

⊕ग वर्गको अपांग परिचयपत्र प्राप्त ११८ जनालाई रू. पाँच सयका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराईएको छ ।

⊕कोभिड लक्षित कृषि कार्यक्रम तर्फ १०० जनाको लागि व्यवसायिक तरकारी खेति प्रबर्द्धन कार्यक्रम तर्फ जनही २० हजार प्रदान गरिएको र विदेशबाट फर्किएका १०० जना व्यवसाय उन्मुख कृषकहरूलाई जनहि २० हजार प्रदान गरिएको यस कार्यक्रम अन्तरगत कूल ४० लाख खर्च गरिएकोछ ।

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

मुख्य उपलब्धीहरू

- जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानको मौज्दात कोष तर्फवाट नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासको लागि रू ६० लाख र नगरपालिकाको रू ७० लाख समपुरक वापत विनियोजन भइ ७ वटा योजना शुरू गरिएकोमा ६ वटा योजना सम्पन्न भई १ वटा योजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।
- वडाका सम्पूर्ण सडकहरू बर्षायाम पश्चात दशै तिहार अगावै मर्मत कार्य गरिएकोछ ।
- जनता मा. वि. वाग्दुलालाई नमुना विद्यालय निर्माणको लागि रू १ करोड ५० लाख नेपाल सरकारवाट प्राप्त भई तद्अनुरूप कार्य भएको छ ।
- पर्यटन अन्तरगत गन्तव्य झुलेनी, लिस्ने, भित्रिकोट अन्तरगत गेट, पार्क लगायत चेरनेटामा स्वागत गेट, शहिद पार्क, विभिन्न कोटहरूको मर्मत सम्भार तथा मठ मन्दिरहरूको संरक्षण गरिएकोछ ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ जम्मा ५१० जना छनौट भएकोमा ५०२ जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको ।

प्यूठान नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बिजुवार, प्यूठान ।

धन्यवाद
